



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CPLAN • Coordenadoria de Planejamento Físico
Cais do Apolo, 739, 1º andar, Recife – PE

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – TRD

1. CONTRATO

Contrato TRT6 46/2024

PROAD Nº 25.619/2024 (Dispensa) e PROAD Nº 29.251/2024 (Acompanhamento)

2. ORDEM DE SERVIÇO

O.S. nº 01/2025 - TRT6/CPLAN

3. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação do Núcleo de Transporte e Manutenção de Veículos do TRT6.

4. LOCAL

Rua do Brum, nº 107 - Bairro do Recife - Recife/PE.

5. COMISSÃO DE RECEBIMENTO

Designada através da Portaria TRT6-SA nº 70/2025, de 09 de maio de 2025, com os seguintes membros:

Durval Soares da Silva Junior e José Flávio Azevedo dos Santos para atuarem como integrantes da Seção de Fiscalização e Orçamento de Obras - SEFOO e Patrícia Paegle para atuar como integrante da Seção de Projetos - SEPRO.

6. DADOS DA CONTRATADA

Razão Social: GR Serviços de Construções e Reformas Prediais Ltda.

CNPJ: 29.492.111/0001-44.

Representante Legal: Luiz Albérico de Miranda Silva.

7. PROCESSO LICITATÓRIO

Dispensa Eletrônica nº 15/2024.

8. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$81.500,00 (Oitenta e um mil e quinhentos reais).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CPLAN • Coordenadoria de Planejamento Físico
Cais do Apolo, 739, 1º andar, Recife – PE

9. PRAZOS

Vigência Contratual: 01 (um) ano contado da data da sua assinatura (assinatura do contrato em 10 de dezembro de 2024).

Execução: 90 dias corridos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.

Datas de Execução dos Serviços:

Início: 27 de janeiro de 2025.

Término: 26 de abril de 2025.

Término do prazo de vigência: 09 de dezembro de 2025.

10. ADITIVOS CONTRATUAIS

A obra foi executada dentro do prazo e valor previstos em contrato, não sendo realizados, portanto, aditivos contratuais.

11. PENALIDADES APLICADAS

Não foram aplicadas penalidades.

12. DOCUMENTOS ANEXOS

Anexo 1 - Termo de Recebimento Provisório.

Anexo 2 - Relatório Fotográfico

13. DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional do Trabalho 6 certifica que procedeu completa vistoria nos serviços executados pela **GR Serviços de Construções e Reformas Prediais Ltda** e verificou a inexistência de quaisquer vícios, defeitos e incorreções aparentes, tendo sido executado todos os serviços da planilha contratual liberados pela Comissão de Gestão e Fiscalização, do objeto do Contrato TRT6 46/2024, pelo que declara recebidos, definitivamente, os serviços executados, podendo a Administração dar por encerrado o Contrato.

14. DECLARAÇÃO DA CONTRATADA

A **GR Serviços de Construções e Reformas Prediais Ltda** declara expressamente que o Tribunal Regional do Trabalho 6 cumpriu as obrigações assumidas, tendo recebido todas as importâncias devidas pelos serviços executados, restando apenas receber a última parcela, relativa ao Recebimento Definitivo dos Serviços, no valor de R\$51.261,31 (cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), a ser quitada conforme prazo estabelecido no Termo de Contrato, e, dando em razão, após o pagamento desta, à plena, ampla e irrevogável quitação.

Assim, pelo presente Termo de Recebimento Definitivo, entregue à **GR Serviços de Construções e Reformas Prediais Ltda** e, após exame, o Tribunal Regional do Trabalho 6 - TRT6 recebe o objeto do Termo de Contrato anteriormente referido,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CPLAN • Coordenadoria de Planejamento Físico
Cais do Apolo, 739, 1º andar, Recife – PE

esclarecendo terem sido totalmente cumpridos os compromissos e avenças pertinentes, existentes entre as partes, ficando à Contratada a responsabilidade nos termos do artigo 618 do Código Civil.

Recife, 12 de maio de 2025

DURVAL SOARES DA SILVA
JUNIOR:00001796

Assinado de forma digital por DURVAL
SOARES DA SILVA JUNIOR:00001796
Dados: 2025.05.14 13:59:10 -03'00'

Durval Soares da Silva Junior

Membro da Comissão de Recebimento Definitivo

JOSE FLAVIO AZEVEDO
DOS
SANTOS:00007585

Assinado de forma digital por
JOSE FLAVIO AZEVEDO DOS
SANTOS:00007585
Dados: 2025.05.14 11:04:12 -03'00'

José Flávio Azevedo dos Santos

Membro da Comissão de Recebimento Definitivo

PATRICIA
PAEGLE:00001
567

Assinado de forma
digital por PATRICIA
PAEGLE:00001567
Dados: 2025.05.14
12:07:46 -03'00'

Patrícia Paegle

Membro da Comissão de Recebimento Definitivo

GR SERVICOS DE
CONSTRUCOES E
REFORMAS PREDIAIS
LT:29492111000144

Assinado de forma digital por
GR SERVICOS DE
CONSTRUCOES E REFORMAS
PREDIAIS LT:29492111000144
Dados: 2025.05.14 07:29:14
-03'00'

LUIZ ALBERICO
DE MIRANDA
SILVA:07395675
436

Assinado de forma
digital por LUIZ
ALBERICO DE MIRANDA
SILVA:07395675436
Dados: 2025.05.14
07:29:45 -03'00'

GR Serviços de Construções e Reforma Prediais Ltda
Contratada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 223,19	R\$ 282,61
1.1	ORSE 12631	RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	Composições Próprias	M²	7,80	R\$ 26,82	R\$ 33,96	R\$ 209,20	R\$ 264,89
1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,68	R\$ 8,33	R\$ 10,55	R\$ 13,99	R\$ 17,72
2	SALA DE REUNIÃO E GUARITA							R\$ 25.429,43	R\$ 32.201,47
2.1	504066	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	ORSE	Un	2,00	R\$ 256,86	R\$ 325,26	R\$ 513,72	R\$ 650,52
2.2	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	51,60	R\$ 73,00	R\$ 92,44	R\$ 3.766,80	R\$ 4.769,90
2.3	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	11,90	R\$ 97,74	R\$ 123,77	R\$ 1.163,11	R\$ 1.472,86
2.4	DIVI001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO EUCATEX, MODELO N4 (PAINEL/VIDRO/VIDRO) COM PERFIL DE AÇO	Composições Próprias	M2	25,10	R\$ 201,99	R\$ 255,78	R\$ 5.069,95	R\$ 6.420,08
2.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,90	R\$ 166,39	R\$ 210,70	R\$ 815,31	R\$ 1.032,43
2.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	10,60	R\$ 97,46	R\$ 123,41	R\$ 1.033,08	R\$ 1.308,15
2.7	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	120,40	R\$ 14,22	R\$ 18,01	R\$ 1.712,09	R\$ 2.168,40
2.8	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,70	R\$ 449,32	R\$ 568,97	R\$ 763,84	R\$ 967,25
2.9	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	120,40	R\$ 11,45	R\$ 14,50	R\$ 1.378,58	R\$ 1.745,80
2.10	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	50,30	R\$ 38,48	R\$ 48,73	R\$ 1.935,54	R\$ 2.451,12
2.11	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	50,30	R\$ 26,14	R\$ 33,10	R\$ 1.314,84	R\$ 1.664,93
2.12	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	50,30	R\$ 13,45	R\$ 17,03	R\$ 676,54	R\$ 856,61
2.13	SINAPI (87263) ADAPTADO	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	Composições Próprias	M²	50,30	R\$ 76,57	R\$ 96,96	R\$ 3.851,47	R\$ 4.877,09
2.14	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	50,30	R\$ 28,52	R\$ 36,11	R\$ 1.434,56	R\$ 1.816,33
3	ESTRUTURA METÁLICA							R\$ 7.359,14	R\$ 9.319,29
3.1	ORSE (12415.2) ADAPTADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL EM AÇO SAE, DIM 100X100 MM, E=2,00MM (#14)	Composições Próprias	M	79,60	R\$ 80,06	R\$ 101,38	R\$ 6.372,78	R\$ 8.069,85

BM-01		BM-02		ACUMULADO		SALDO	
QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI		COM BDI		COM BDI		COM BDI
	R\$ 282,61		R\$ -		R\$ 282,61		R\$ -
7,80	R\$ 264,89		R\$ -	7,80	R\$ 264,89	0,00	R\$ -
1,68	R\$ 17,72		R\$ -	1,68	R\$ 17,72	0,00	R\$ -
	R\$ 16.100,74		R\$ 16.100,73		R\$ 32.201,47		R\$ -
	R\$ -	2,00	R\$ 650,52	2,00	R\$ 650,52	0,00	R\$ -
32,58	R\$ 3.011,75	19,02	R\$ 1.758,15	51,60	R\$ 4.769,90	0,00	R\$ -
11,90	R\$ 1.472,86		R\$ -	11,90	R\$ 1.472,86	0,00	R\$ -
15,00	R\$ 3.836,70	10,10	R\$ 2.583,38	25,10	R\$ 6.420,08	0,00	R\$ -
	R\$ -	4,90	R\$ 1.032,43	4,90	R\$ 1.032,43	0,00	R\$ -
8,80	R\$ 1.086,01	1,80	R\$ 222,14	10,60	R\$ 1.308,15	0,00	R\$ -
	R\$ -	120,40	R\$ 2.168,40	120,40	R\$ 2.168,40	0,00	R\$ -
	R\$ -	1,70	R\$ 967,25	1,70	R\$ 967,25	0,00	R\$ -
	R\$ -	120,40	R\$ 1.745,80	120,40	R\$ 1.745,80	0,00	R\$ -
	R\$ -	50,30	R\$ 2.451,12	50,30	R\$ 2.451,12	0,00	R\$ -
	R\$ -	50,30	R\$ 1.664,93	50,30	R\$ 1.664,93	0,00	R\$ -
	R\$ -	50,30	R\$ 856,61	50,30	R\$ 856,61	0,00	R\$ -
50,30	R\$ 4.877,09		R\$ -	50,30	R\$ 4.877,09	0,00	R\$ -
50,30	R\$ 1.816,33		R\$ -	50,30	R\$ 1.816,33	0,00	R\$ -
	R\$ 3.261,75		R\$ 6.057,54		R\$ 9.319,29		R\$ -
27,99	R\$ 2.837,38	51,61	R\$ 5.232,47	79,60	R\$ 8.069,85	0,00	R\$ -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	30,30	R\$ 9,84	R\$ 12,46	R\$ 298,15	R\$ 377,54
3.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	30,30	R\$ 8,11	R\$ 10,27	R\$ 245,73	R\$ 311,18
3.4	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	SINAPI	M	119,50	R\$ 1,19	R\$ 1,51	R\$ 142,21	R\$ 180,45
3.5	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	30,30	R\$ 9,91	R\$ 12,55	R\$ 300,27	R\$ 380,27
4	TELHADO							R\$ 9.117,24	R\$ 11.545,32
4.1	92576	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	50,60	R\$ 29,02	R\$ 36,75	R\$ 1.468,41	R\$ 1.859,55
4.2	512723	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	ORSE	m2	50,60	R\$ 136,27	R\$ 172,56	R\$ 6.895,26	R\$ 8.731,54
4.3	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	4,90	R\$ 153,79	R\$ 194,74	R\$ 753,57	R\$ 954,23
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LÓGICA E DE AR CONDICIONADO							R\$ 17.633,58	R\$ 22.330,08
5.1	ENTRE QUADROS ELÉTRICOS							R\$ 5.831,10	R\$ 7.384,21
5.1.1	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	234,00	R\$ 13,10	R\$ 16,59	R\$ 3.065,40	R\$ 3.882,06
5.1.2	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	93,00	R\$ 15,66	R\$ 19,83	R\$ 1.456,38	R\$ 1.844,19
5.1.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 14,39	R\$ 18,22	R\$ 201,46	R\$ 255,08
5.1.4	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 91,96	R\$ 116,45	R\$ 91,96	R\$ 116,45
5.1.5	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 294,14	R\$ 372,47	R\$ 588,28	R\$ 744,94
5.1.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 102,43	R\$ 129,71	R\$ 204,86	R\$ 259,42
5.1.7	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,83	R\$ 21,31	R\$ 33,66	R\$ 42,62
5.1.8	508699	Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm	ORSE	un	5,00	R\$ 37,82	R\$ 47,89	R\$ 189,10	R\$ 239,45
5.2	ELÉTRICA							R\$ 3.442,74	R\$ 4.360,26
5.2.1	ORSE (541) ADAPTADO	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, ADAPTÁVEL À MODULAÇÃO DO FORRO DE GESSO DE 62X62, INCLUSO 4 LÂMPADAS TUBULARES T8	Composições Próprias	UND	8,00	R\$ 242,93	R\$ 307,62	R\$ 1.943,44	R\$ 2.460,96

QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL
3,00	R\$ 37,38	27,30	R\$ 340,16	30,30	R\$ 377,54	0,00	R\$ -
12,00	R\$ 123,24	18,30	R\$ 187,94	30,30	R\$ 311,18	0,00	R\$ -
50,00	R\$ 75,50	69,50	R\$ 104,95	119,50	R\$ 180,45	0,00	R\$ -
15,00	R\$ 188,25	15,30	R\$ 192,02	30,30	R\$ 380,27	0,00	R\$ -
	R\$ 4.040,86		R\$ 7.504,46		R\$ 11.545,32		R\$ -
50,60	R\$ 1.859,55		R\$ -	50,60	R\$ 1.859,55	0,00	R\$ -
7,11	R\$ 1.227,08	43,49	R\$ 7.504,46	50,60	R\$ 8.731,54	0,00	R\$ -
4,90	R\$ 954,23		R\$ -	4,90	R\$ 954,23	0,00	R\$ -
	R\$ 4.466,02		R\$ 17.864,06		R\$ 22.330,08		R\$ -
	R\$ 158,64		R\$ 7.225,57		R\$ 7.384,21		R\$ -
	R\$ -	234,00	R\$ 3.882,06	234,00	R\$ 3.882,06	0,00	R\$ -
8,00	R\$ 158,64	85,00	R\$ 1.685,55	93,00	R\$ 1.844,19	0,00	R\$ -
	R\$ -	14,00	R\$ 255,08	14,00	R\$ 255,08	0,00	R\$ -
	R\$ -	1,00	R\$ 116,45	1,00	R\$ 116,45	0,00	R\$ -
	R\$ -	2,00	R\$ 744,94	2,00	R\$ 744,94	0,00	R\$ -
	R\$ -	2,00	R\$ 259,42	2,00	R\$ 259,42	0,00	R\$ -
	R\$ -	2,00	R\$ 42,62	2,00	R\$ 42,62	0,00	R\$ -
	R\$ -	5,00	R\$ 239,45	5,00	R\$ 239,45	0,00	R\$ -
	R\$ 84,44		R\$ 4.275,82		R\$ 4.360,26		R\$ -
	R\$ -	8,00	R\$ 2.460,96	8,00	R\$ 2.460,96	0,00	R\$ -

22M

QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI		COM BDI		COM BDI		COM BDI
5,44	R\$ 84,44	9,56	R\$ 148,21	15,00	R\$ 232,65	0,00	R\$ -
	R\$ -	1,00	R\$ 37,50	1,00	R\$ 37,50	0,00	R\$ -
	R\$ -	2,00	R\$ 99,36	2,00	R\$ 99,36	0,00	R\$ -
	R\$ -	2,00	R\$ 72,82	2,00	R\$ 72,82	0,00	R\$ -
	R\$ -	3,00	R\$ 109,23	3,00	R\$ 109,23	0,00	R\$ -
	R\$ -	2,00	R\$ 125,66	2,00	R\$ 125,66	0,00	R\$ -
	R\$ -	3,00	R\$ 375,99	3,00	R\$ 375,99	0,00	R\$ -
	R\$ -	1,00	R\$ 30,77	1,00	R\$ 30,77	0,00	R\$ -
	R\$ -	187,00	R\$ 815,32	187,00	R\$ 815,32	0,00	R\$ -
	R\$ -		R\$ 4.552,59		R\$ 4.552,59		R\$ -
	R\$ -	470,00	R\$ 2.303,00	470,00	R\$ 2.303,00	0,00	R\$ -
	R\$ -	8,00	R\$ 365,52	8,00	R\$ 365,52	0,00	R\$ -
	R\$ -	47,30	R\$ 937,96	47,30	R\$ 937,96	0,00	R\$ -
	R\$ -	61,00	R\$ 946,11	61,00	R\$ 946,11	0,00	R\$ -
	R\$ 4.222,94		R\$ 1.810,08		R\$ 6.033,02		R\$ -
34,10	R\$ 1.685,90		R\$ -	34,10	R\$ 1.685,90	0,00	R\$ -
34,10	R\$ 2.537,04		R\$ -	34,10	R\$ 2.537,04	0,00	R\$ -
	R\$ -	12,00	R\$ 207,36	12,00	R\$ 207,36	0,00	R\$ -
	R\$ -	68,20	R\$ 872,96	68,20	R\$ 872,96	0,00	R\$ -
	R\$ -	78,30	R\$ 729,76	78,30	R\$ 729,76	0,00	R\$ -
	R\$ -		R\$ 196,67		R\$ 196,67		R\$ -



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	SINAPI	M2	50,30	R\$ 3,09	R\$ 3,91	R\$ 155,43	R\$ 196,67
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 4.441,60	R\$ 5.624,56
7.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88,00	R\$ 31,50	R\$ 39,89	R\$ 2.772,00	R\$ 3.510,32
7.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	R\$ 104,35	R\$ 132,14	R\$ 1.669,60	R\$ 2.114,24
								VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 64.359,61
								VALOR DO BDI	R\$ 17.140,39
								VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 81.500,00

QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI
	R\$ -
	R\$ 2.086,71
32,65	R\$ 1.302,33
5,94	R\$ 784,38
	R\$ 23.879,33
	R\$ 6.359,36
	R\$ 30.238,69

QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI
50,30	R\$ 196,67
	R\$ 3.537,85
55,35	R\$ 2.207,99
10,06	R\$ 1.329,86
	R\$ 40.480,28
	R\$ 10.781,03
	R\$ 51.261,31

QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI		COM BDI
50,30	R\$ 196,67	0,00	R\$ -
	R\$ 5.624,56		R\$ -
88,00	R\$ 3.510,32	0,00	R\$ -
16,00	R\$ 2.114,24	0,00	R\$ -
	R\$ 64.359,61		R\$ -
	R\$ 17.140,39		R\$ -
	R\$ 81.500,00		R\$ -

Recife/PE., 07 de maio de 2025


Luiz Alberico de Miranda Silva
GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA
Representante Legal da Empresa
CIC/MF Nº 073.956.754-36


Micheline Gomes Romão de Miranda Valença
Engenheira Civil CREA nº 35.632-D/PE
CPF/MF nº 033.465.474-26
Responsável Técnica



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	Contratação de uma empresa especializada em construção civil para execução de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação no Galpão de Transportes, com vistas à melhoria da segurança e condições de trabalho de servidores e prestadores de serviços.	DATA : 08/11/2024	BDI : 26,63%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de uma empresa especializada em construção civil para execução de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação no Galpão de Transportes, com vistas à melhoria da segurança e condições de trabalho de servidores e prestadores de serviços.	FONTE	VERSÃO
			ORSE	2024/06
			SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	Rua do Brum, nº 107, no Bairro do Recife-PE		HORA	MES
CLIENTE:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO		64,35%	46,41%
			0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 282,61	100,00%			100,00%
			R\$ 282,61			R\$ 282,61
2	SALA DE REUNIÃO E GUARITA	R\$ 32.201,47	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 16.100,74	R\$ 12.880,59	R\$ 3.220,14	R\$ 32.201,47
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 9.319,29	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 3.261,75	R\$ 3.261,75	R\$ 2.795,79	R\$ 9.319,29
4	TELHADO	R\$ 11.545,32	35,00%	45,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 4.040,86	R\$ 5.195,39	R\$ 2.309,07	R\$ 11.545,32
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS DE LÓGICA E DE AR CONDICIONADO	R\$ 22.330,08	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
			R\$ 4.466,02	R\$ 8.932,03	R\$ 8.932,03	R\$ 22.330,08
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 196,67			100,00%	100,00%
					R\$ 196,67	R\$ 196,67
SUBTOTAL			R\$ 28.151,98	R\$ 30.269,76	R\$ 17.453,70	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.624,56	37,10%	39,89%	23,01%	100,00%
			R\$ 2.086,71	R\$ 2.243,64	R\$ 1.294,21	R\$ 5.624,56
TOTAL POR ETAPA			R\$ 30.238,69	R\$ 32.513,40	R\$ 18.747,91	R\$ 81.500,00
TOTAL ACUMULADO			R\$ 30.238,69	R\$ 62.752,09	R\$ 81.500,00	

Recife/PE., 12 de novembro de 2024

Luiz Alêrico de Miranda Silva
GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA
Representante Legal da Empresa
CIC/MF Nº 073.956.754-36

Micheline Gomes Romão de Miranda Valença
Engenheira Civil CREA nº 35.632-D/PE
CPF/MF nº 033.465.474-26
Responsável Técnica





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CPLAN • Coordenadoria de Planejamento Físico
Cais do Apolo, 739, 1º andar, Recife – PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Recebimento Provisório e Definitivo

1. CONTRATO

Contrato TRT6 46/2024

PROAD Nº 25.619/2024 (Dispensa) e PROAD Nº 29.251/2024 (Acompanhamento)

2. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação do Núcleo de Transporte e Manutenção de Veículos do TRT6.

3. DADOS DA CONTRATADA

Razão Social: GR Serviços de Construções e Reformas Prediais Ltda.

CNPJ: 29.492.111/0001-44.

Representante Legal: Luiz Albérico de Miranda Silva.

O presente relatório fotográfico tem como objetivo registrar os serviços executados pela contratada, para fins de recebimento da obra.



Foto 1: Estrutura metálica do salão e telhas.



Foto 2: Estrutura metálica do salão e telhas.



Foto 3: Início do fechamento das paredes em drywall.



Foto 4: Início do fechamento das paredes em drywall.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CPLAN • Coordenadoria de Planejamento Físico
Cais do Apolo, 739, 1º andar, Recife – PE



Foto 5: Estrutura metálica, paredes e laje.



Foto 6: Estrutura metálica, paredes e laje.



Foto 7: Laje da guarita - vista inferior.



Foto 8: Laje da guarita - vista superior.

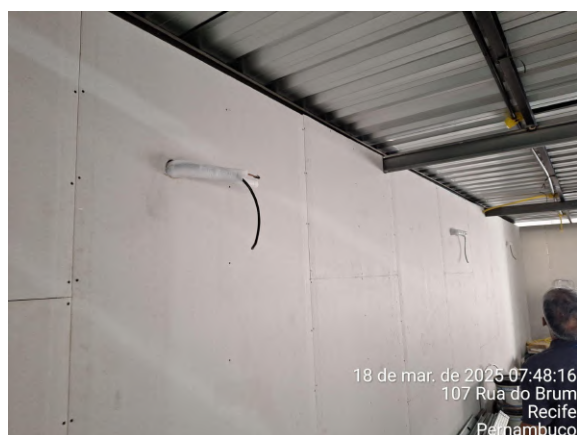


Foto 9: Instalações para ar condicionado tipo *split* - salão.



Foto 10: Contrapiso do salão.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CPLAN • Coordenadoria de Planejamento Físico
Cais do Apolo, 739, 1º andar, Recife – PE



Foto 11: Início do assentamento do porcelanato.



Foto 12: Assentamento de soleiras.



Foto 13: Instalações elétricas e pintura da estrutura.



Foto 14: Vista da laje da guarita depois da desforma.



Foto 15: Porcelanato da guarita assentado



Foto 16: Paredes da guarita e instalação para *split*.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CPLAN • Coordenadoria de Planejamento Físico
Cais do Apolo, 739, 1º andar, Recife – PE



Foto 17: Instalação das divisórias.



Foto 18: Instalação das divisórias.



Foto 19: Instalações elétricas e rejuntamento de piso.



Foto 20: Quadro elétrico do salão em montagem.



Foto 21: Rejuntamento das placas com fita anti-trinca.



Foto 22: Rejuntamento das placas com fita anti-trinca.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CPLAN • Coordenadoria de Planejamento Físico
Cais do Apolo, 739, 1º andar, Recife – PE



Foto 23: Emassamento de paredes e forro.

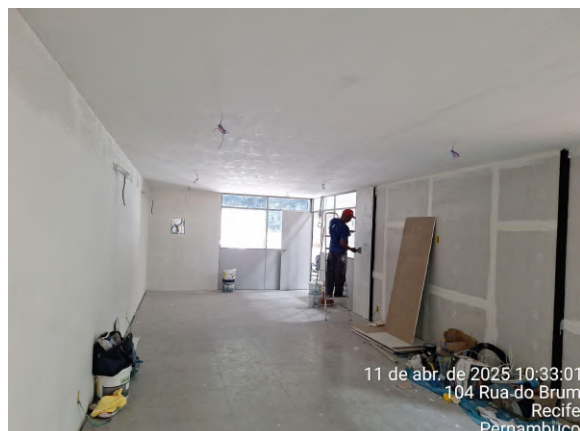


Foto 24: Emassamento de paredes e forro.



Foto 25: Fechamento das paredes da guarita.



Foto 26: Piso da guarita concluído.



Foto 27: Pintura da guarita.



Foto 28: Retoques de pintura na guarita.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CPLAN • Coordenadoria de Planejamento Físico
Cais do Apolo, 739, 1º andar, Recife – PE

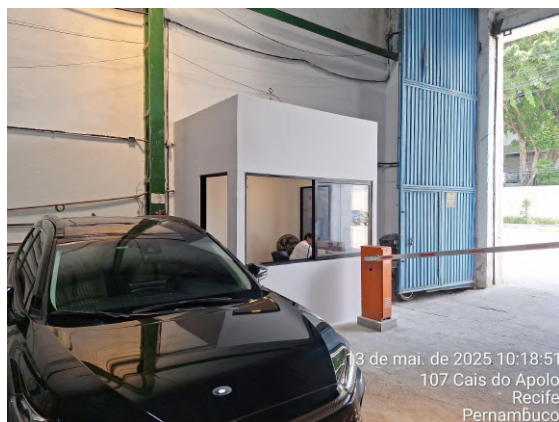


Foto 29: Vista externa da guarita.



Foto 30: Vista externa do salão.



Foto 31: Vista interna do salão.



Foto 32: Vista interna do salão.

Recife, 13 de maio de 2025.

José Flávio Azevedo dos Santos
Membro Comissão de Recebimento Definitivo

Durval Soares da Silva Junior
Membro Comissão de Recebimento Definitivo

Patrícia Paegle
Membro Comissão de Recebimento Definitivo



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS



20250514u29492111000144

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000408

Data e Hora de Emissão

14/05/2025 14:13:10

Código de Verificação

QIBI-3XPE

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **29.492.111/0001-44**

Inscrição Municipal: **602.326-6**

Nome/Razão Social: **GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PEDIAIS LTDA**

Endereço: **RUA FRANCISCO VITA 164, CXPST:A - CORDEIRO - CEP: 50630-190**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **grupogrservicos@outlook.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **UNIAO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO**

CPF/CNPJ: **02.566.224/0001-90**

Inscrição Municipal: **122.250-3**

Endereço: **CAIS DO APOLO 739 - RECIFE - CEP: 50030-230**

Tel.: **3225-3514**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 2ª (segunda) medição do Contrato TRT6 nº 45/2024, cujo objeto é a execução dos serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação no Galpão de Transportes do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. A obra está sendo realizada na Rua do Brum, nº 107, bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-260, tudo em conformidade com a Dispensa Eletrônica nº 15/2024.

Valor da Mão de Obra (70%)..... R\$ 35.882,92

Valor dos Materiais (30%)..... R\$ 15.378,39

Valor Total da Medição (100%)..... R\$ 51.261,31

* Empresa optante do LUCRO PRESUMIDO

Dados para Depósito

Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Agência: 0678

Conta Corrente: 000578409486-2

Operação: 003 - Pessoa Jurídica

Favorecido: GR Serviços de Construções e Reformas Prediais Ltda

CNPJ: 29.492.111/0001-44

Retenção de COFINS
R\$ 1.537,84

Retenção de CSLL
R\$ 512,61

Retenção de INSS
R\$ 3.947,12

Retenção de IRPJ
R\$ 815,14

Retenção de PIS
R\$ 333,20

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 51.261,31

Código da Atividade Prestada

4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem...

Deduções (R\$)

15.378,39

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

35.882,92

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

1.794,15

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- CEI / Código da Obra: CO462024TRT



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

Processo administrativo: 025619/2024

Assuntos: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A ADEQUAÇÃO NO GALPÃO DE TRANSPORTE DESTE TRIBUNAL. PROAD 25619/2024 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO GALPÃO DE TRANSPORTE DESTE TRIBUNAL. PROAD 25619/2024

JOSE FLAVIO AZEVEDO DOS SANTOS
15/05/2025 09:08
DURVAL SOARES DA SILVA JUNIOR
15/05/2025 13:04
ANA LUIZA MARINHO DE AZEVEDO E SILVA
15/05/2025 13:45

Atesto, para os devidos fins, com fundamento no [preencher o fundamento], que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: GR SERVICOS DE CONSTRUÇOES E REFORMAS PREDIAIS LTDA

CPF/CNPJ: 29.492.111/0001-44

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
00000408	R\$51.261,31	R\$0,00	R\$51.261,31	R\$41.009,05	R\$10.252,26



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.492.111/0001-44 DUNS®: 91*****08
Razão Social: GR SERVICOS DE CONSTRUÇOES E REFORMAS PREDIAIS LTDA
Nome Fantasia: GR SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	01/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/07/2025
Receita Municipal	Validade:	01/06/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/05/2025 14:28

CPF: 073.XXX.XXX-36 Nome: LUIZ ALBERICO DE MIRANDA SILVA

Ass: _____

1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CPLAN • Coordenadoria de Planejamento Físico
Caís do Apolo, 739, 1º andar, Recife – PE

Ofício TRT6/CPLAN nº. 11/2025

Recife, data conforme assinatura eletrônica

Ao Senhor
Enoque de Souza e Silva Sobrinho,
Diretor da Secretaria de Orçamento e Finanças do TRT 6ª Região

Referência: **PROAD's 25.619/2024 (Dispensa) e 29.251/2024 (acompanhamento)** – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ADEQUAÇÃO DO NÚCLEO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRT6.

Assunto: **Solicita pagamento relativo aos Empenhos 2024NE001218 e 2024NE001219**

Prezado Senhor,

Solicitamos o pagamento relativo aos Empenhos **2024NE001218 e 2024NE001219**, em favor da empresa **GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA.**, no valor total de **R\$ 51.261,31 (cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais, trinta e um centavos)**, referente ao **pagamento de 2ª medição** dos serviços da unidade abaixo especificada, solicitados por esta Coordenadoria de Planejamento Físico – CPLAN:

Contrato Administrativo Nº46/2024			
DOCs	UNIDADE JUDICIÁRIA/ ADMINISTRATIVA	Boletim Medição	Pagamento (R\$)
105 a 111	NÚCLEO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRT6	2º	51.261,31
		TOTAL R\$ 51.261,31	

Indicamos como mecanismo compensatório para cobertura da referida despesa os Elementos de Despesa **449052.51 e 339039.16**.

Informamos que, referente ao 2º Boletim de Medição - **Nota Fiscal nº 0408**, os **itens 2.1 e 2.4** referem-se a bem permanente.

Informamos que o percentual definido para compensação da referida nota é de 80% para a 1ª Instância e 20% para 2ª Instância.

Respeitosamente,

Ana Luiza Marinho de Azevedo e Silva
Coordenadora de Planejamento Físico – CPLAN

Durval Soares da Silva Junior
Engenheiro Eletrotécnico – CREA-PE 046612
Chefe do SEFOO/CPLAN TRT6
