



ENERGIA SOLAR

RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO GERADOR FOTOVOLTAICO 22,25 kWp

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Luiz Alberto Wagner Pinto Junior

Valesca Bettim Feltrin

PALMARES – PE

2022

55 3217.5111

ROD RS 223, KM46,4 S/N Bairro Arroio Grande, Ibirubá - RS



ENERGIA SOLAR

Sumário

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA	3
OBJETIVO.....	4
INSPEÇÕES.....	5
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	18

55 3217.5111

ROD RS 223, KM46,4 S/N Bairro Arroio Grande, Ibirubá - RS

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A empresa **HCC ENGENHARIA ELÉTRICA**, inscrita no CNPJ 07.261.798/000174, situada no município de Ibirubá – RS. Somos uma empresa que, desde 2005, presta serviços em engenharia elétrica. Após 10 anos de atuação e experiência no mercado, resolvemos apostar em um dos setores que mais cresce no Brasil, o de energia solar.

Desde então, oferecemos soluções personalizadas de energia solar para residências, empresas, indústrias e agronegócios, proporcionando independência energética para os nossos clientes e reduzindo os danos ao meio ambiente.

Além da instalação dos sistemas fotovoltaicos, também ministramos cursos e disponibilizamos o nosso modelo de negócio por meio de franquias, para aqueles que, como nós, querem empreender no setor de energia solar.

Temos como valores:

A segurança dos nossos colaboradores;

- A parceria com clientes, fornecedores, colaboradores e sociedade em geral;
- A inovação para sempre buscar por novas maneiras de auxiliar nossos clientes;
- E a motivação para a realização de todas as nossas atividades.

Sempre preocupada em evoluir a empresa desenvolve e executa obras onde o principal objetivo é o desenvolvimento sustentável realizando práticas racionais de utilização de recursos.

OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os dados obtidos a partir do comissionamento do sistema fotovoltaico instalado conforme NBR 16.274: Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho. Os dados do comissionamento foram realizados no Tribunal Regional do Trabalho Sexta Região - Vara de Palmares, situado na Av Miguel Jacele, nº 6, CEP: 55540-000 no município de Palmares, estado do Pernambuco.

O comissionamento dessa obra foi feito pela Engenheira Valesca Bettim Feltrin, representando a HCC Engenharia Elétrica, juntamente com a fiscalização do Tribunal Regional do Trabalho Sexta Região, representado pelo Engenheiro Durval Soares da Silva Júnior.

INSPEÇÕES

Inspeção visual e termográfica

- a) Deve ser realizada inspeção visual das estruturas metálicas, módulos, conectores e quadros;

A colaboradora da HCC Engenharia Elétrica juntamente com a fiscalização do Tribunal Regional do Trabalho Sexta Região, realizaram a vistoria e inspeção visual na data de 16 de novembro de 2022. O horário da inspeção e comissionamento foi entorno das 13:00 da tarde, nesta data o dia estava ensolarado e com poucas nuvens.

A seguir estão as imagens dos equipamentos in loco. Os cabos foram identificados abaixo do inversor e em cima do telhado, no final das strings.



Figura 1 – Foto do inversor.



Figura 2 – Foto da Stringbox.



Figura 3 – Quadro geral dos disjuntores.

b) Mediante uma câmera termográfica e com o gerador fotovoltaico operando normalmente (conectado à rede), deve ser observada a temperatura dos módulos fotovoltaicos, registrando a diferença de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta próxima ou maior que 100° C;

Também na data de 16 de novembro de 2022, foram realizadas as inspeções termográficas em módulos selecionados de forma aleatória. Neste dia, as condições de céu estavam estáveis, com poucas nuvens e vento, de forma que assegurava que houvesse corrente suficiente para que as diferenças de temperatura fossem perceptíveis.

Os resultados destes testes podem ser observados nas Figuras 4 a 23 apresentadas abaixo. Salienta-se que, durante a inspeção nenhum módulo apresentou temperatura absoluta próxima ou maior que 100° C, ou seja, nenhum módulo em operação apresentou anomalia térmica de acordo com esse teste.

Além disso, conforme a Tabela 1, em pleno funcionamento entorno das 13:00h o sistema apresentou todas as temperaturas abaixo 50°C e se pode constatar temperatura média de 37°C.

Por fim, a temperatura dos módulos apresentou característica relativamente uniforme, sem nenhuma diferença de temperatura significativa ou pontos quentes.

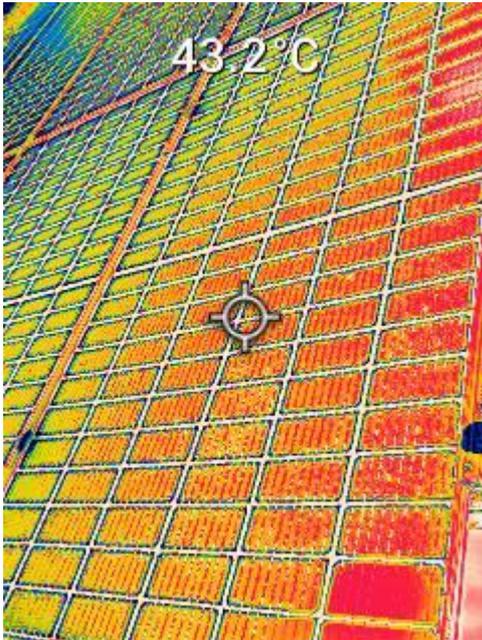


Figura 4 - Imagem térmica módulo 1.



Figura 5 - Imagem térmica módulo 2.

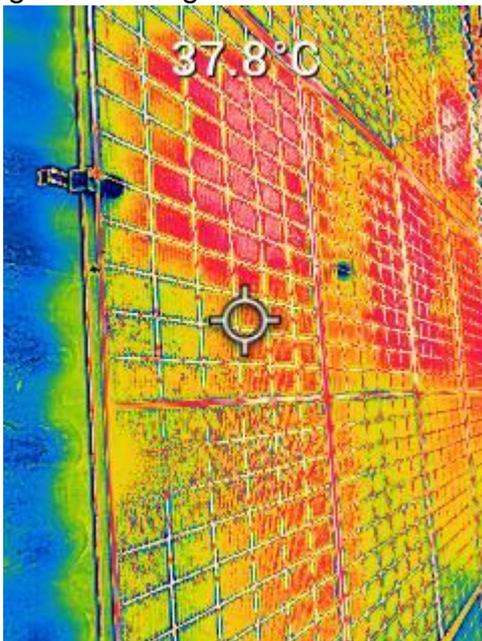


Figura 6 - Imagem térmica módulo 3.

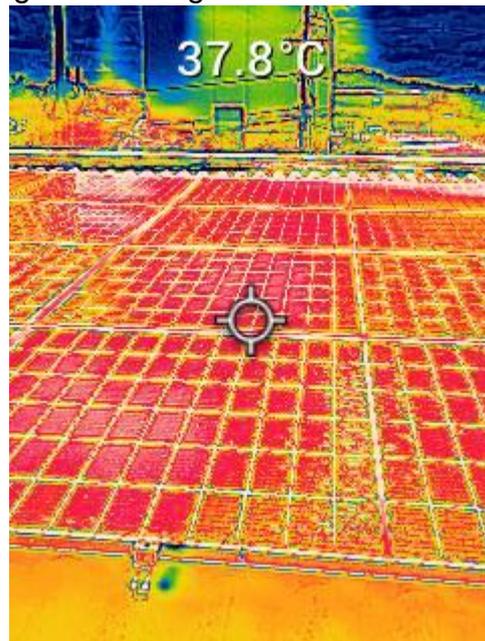


Figura 7 - Imagem térmica módulo 4.

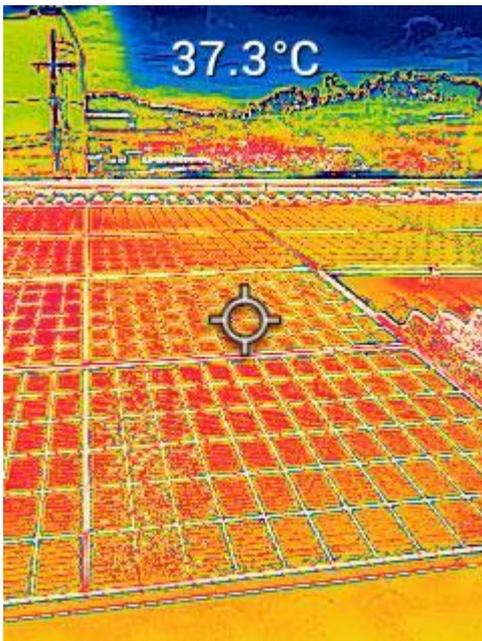


Figura 8 - Imagem térmica módulo 5.

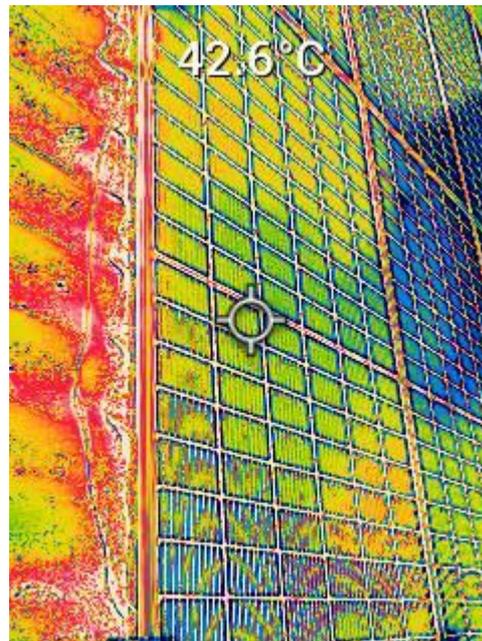


Figura 9 - Imagem térmica módulo 6.

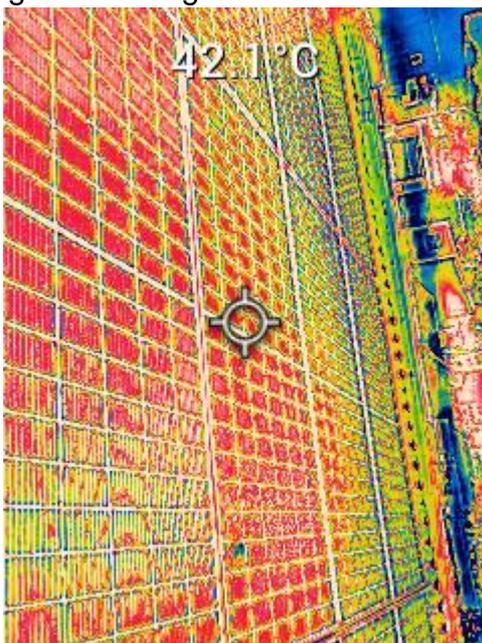


Figura 10 - Imagem térmica módulo 7.



Figura 11 - Imagem térmica módulo 8.

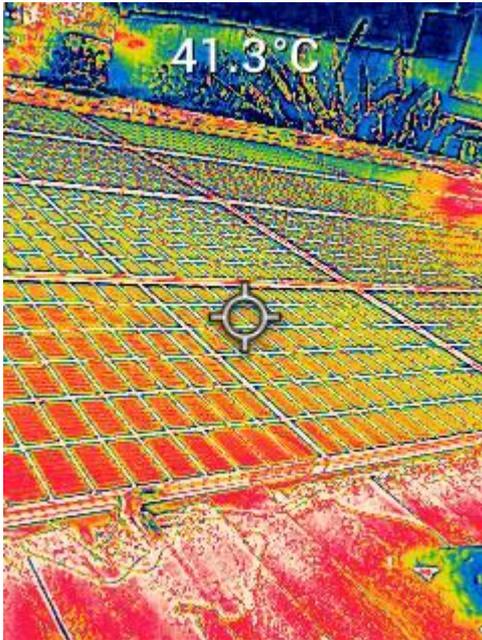


Figura 12 - Imagem térmica módulo 9.

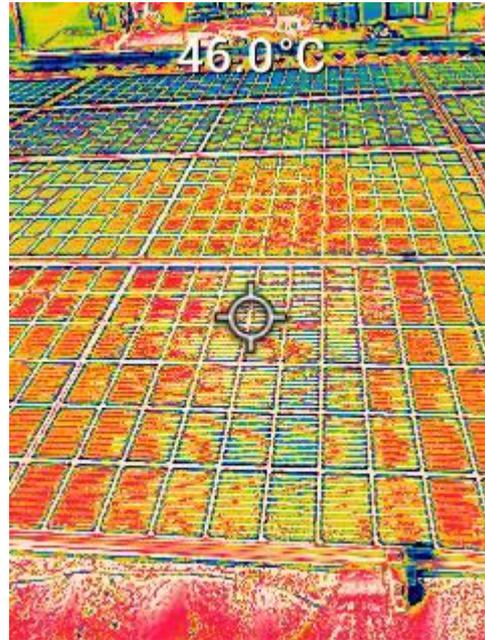


Figura 13 - Imagem térmica módulo 10.



Figura 14 - Imagem térmica módulo 11.

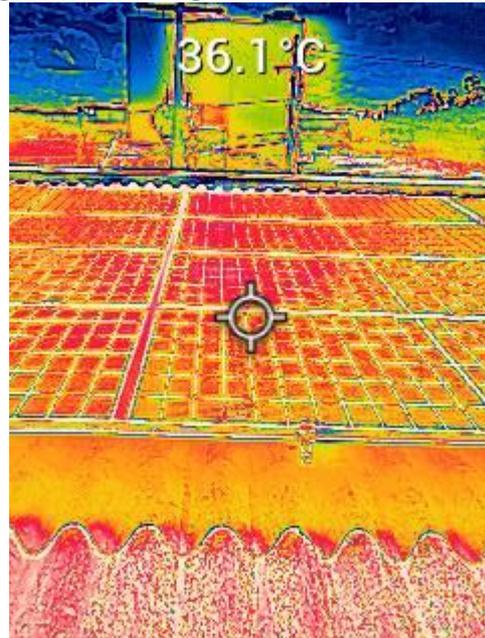


Figura 15 - Imagem térmica módulo 12.

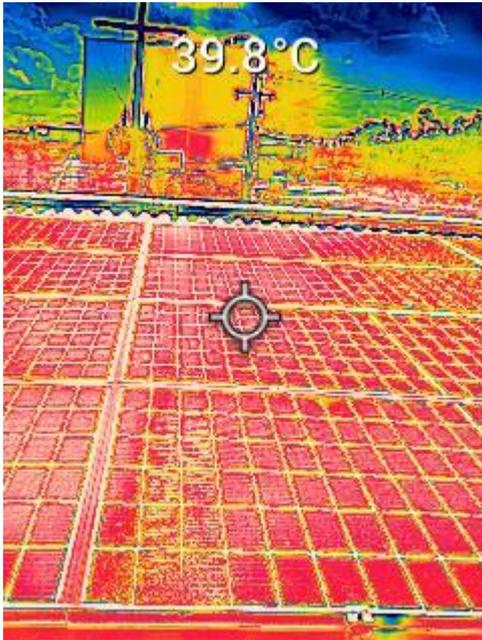


Figura 16 - Imagem térmica módulo 13.

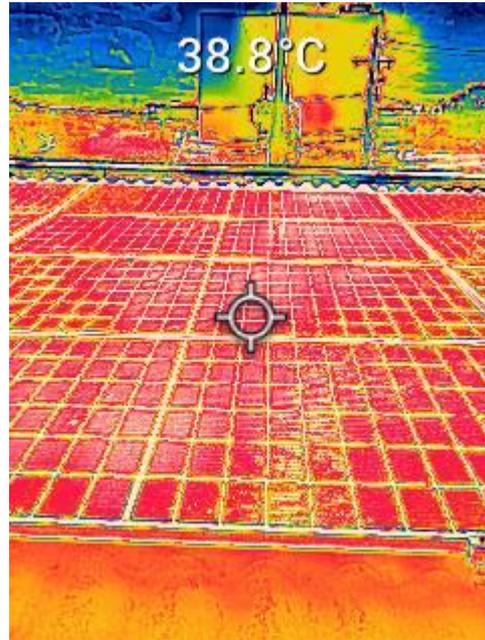


Figura 17 - Imagem térmica módulo 14.

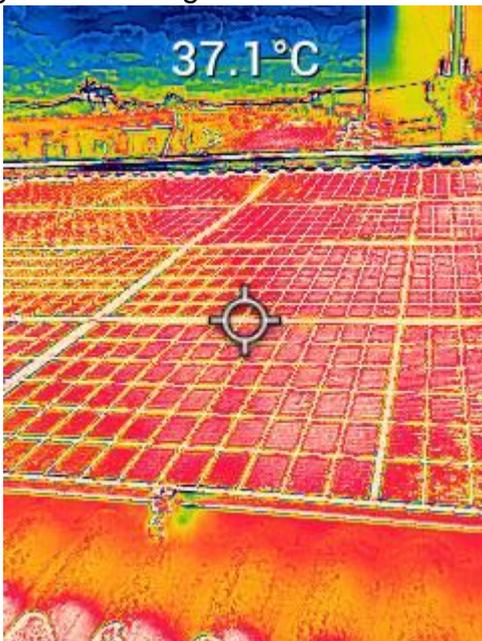


Figura 18 - Imagem térmica módulo 15.

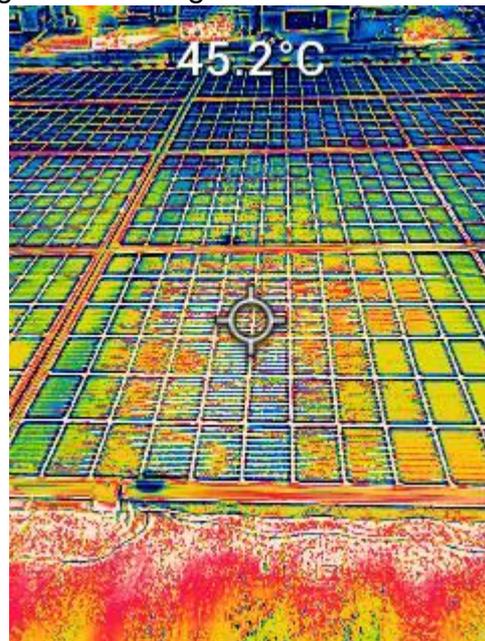


Figura 19 - Imagem térmica módulo 16.

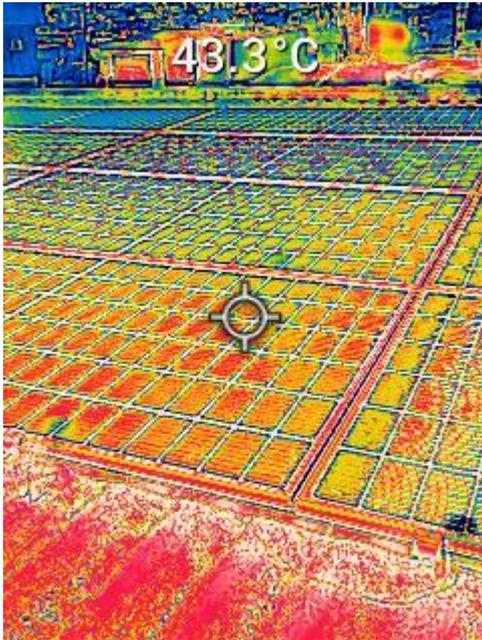


Figura 20 - Imagem térmica módulo 17.



Figura 21 - Imagem térmica módulo 18.



Figura 22 - Imagem térmica módulo 19.

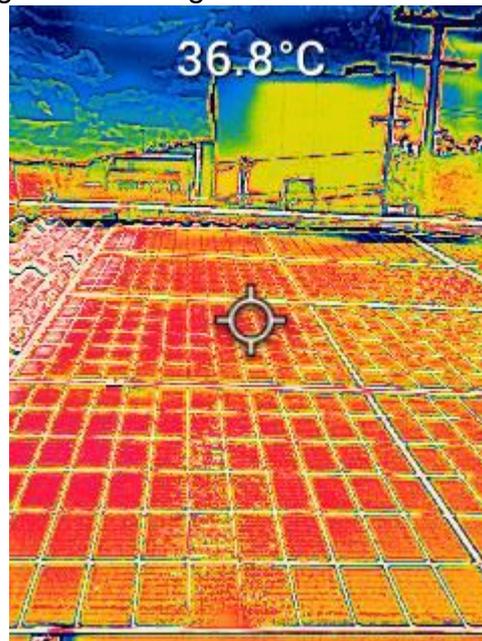


Figura 23 - Imagem térmica módulo 20.

Tabela 1- Resultados das inspeções térmicas nos módulos, bem como a temperatura média da inspeção.

Medidas	Valores (°C)
1	43,2
2	42,8
3	37,8
4	37,8
5	37,3
6	42,6
7	42,1
8	41,9
9	41,3
10	46
11	40,4
12	36,1
13	39,8
14	38,8
15	37,1
16	45,2
17	43,3
18	46
19	38,5
20	36,8
21	36,9
22	38,5
23	36,8
MÉDIA	37,08

c) Deve ser realizada também avaliação termográfica dos quadros elétricos.

De forma similar ao ensaio realizado com os módulos fotovoltaicos, também para verificar diferenças significativas de temperatura e pontos quentes, todos os quadros do sistema gerador foram inspecionados. O resultado dessa inspeção pode ser demonstrado nas Figuras 24 e 25 apresentadas nesta seção.



Figura 24 – Imagem com a câmera térmica da stringbox.

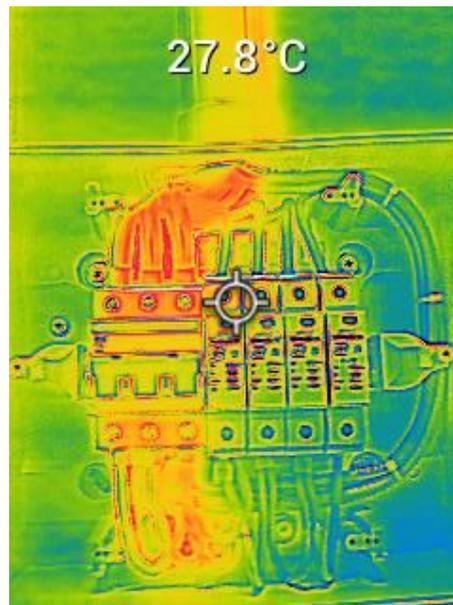


Figura 25 – Imagem com a câmera térmica do quadro principal da conexão CA.

Testes operacionais

a) Testes de tensão CA

Esse teste consiste na aferição da tensão CA que está chegando no inversor. Os valores obtidos estão na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores obtidos na tensão por fases

	TENSÃO (V)		TENSÃO (V)
F₁N	227 V	F₁F₂	378 V
F₂N	227 V	F₂F₃	378 V
F₃N	228 V	F₁F₃	381 V

b) Testes de tensão CC – Inversor Ligado (V_{MPP})

Esse teste consiste na aferição da tensão CC por string com o inversor ligado e operando normalmente. Os valores obtidos estão na Tabela 3, a nomenclatura utilizada na Tabela 3 é seguindo a etiquetagem que está na fixada na stringbox.

Tabela 3 – Valores obtidos na tensão por string

INVERSOR 25kW	STRING 1	STRING 2
MPPT A1 e A2	426 V	437 V
MPPT B1 e B2	473 V	522 V

c) Testes de corrente CC – Inversor Ligado (I_{dc})

Esse teste consiste na aferição da corrente CC por string com o inversor ligado e operando normalmente. Os valores obtidos estão na Tabela 4.

Tabela 4 – Valores obtidos para as correntes

d) Testes de tensão CC – Inversor Desligado (V_{oc})

INVERSOR 25kW	STRING 1		STRING 2	
	+	-	+	-
MPPT A1 e A2	5,16 A	3,56 A	5,20 A	3,78 A
MPPT B1 e B2	5,66 A	6,08 A	5,62 A	4,33 A

Esse teste consiste na aferição da tensão CC por string com o inversor desligado. Os valores obtidos estão na Tabela 5.

Tabela 5 – Valores obtidos para as tensões V_{oc}

INVERSOR 25kW	STRING 1	STRING 2
MPPT A1 e A2	577,4 V	573,6 V
MPPT B1 e B2	528,9 V	528,4 V

e) Resistência de aterramento

Esse teste consiste na aferição da resistência de aterramento, para esse teste é utilizado o terrômetro. A resistência de aterramento ficou de $R = 4,07\Omega$, sendo que o máximo permitido é de $R = 10\Omega$. Desta forma, o sistema solar está dentro dos parâmetros exigidos. A Figura 26, mostra a medição com o equipamento *in loco*.



Figura 26 – Medição com o terrômetro da resistência de aterramento.

Monitoramento e Desempenho

O sistema de monitoramento da Growatt da unidade de Palmares está online e funcionando. Figura 27 mostra que o sistema está online.

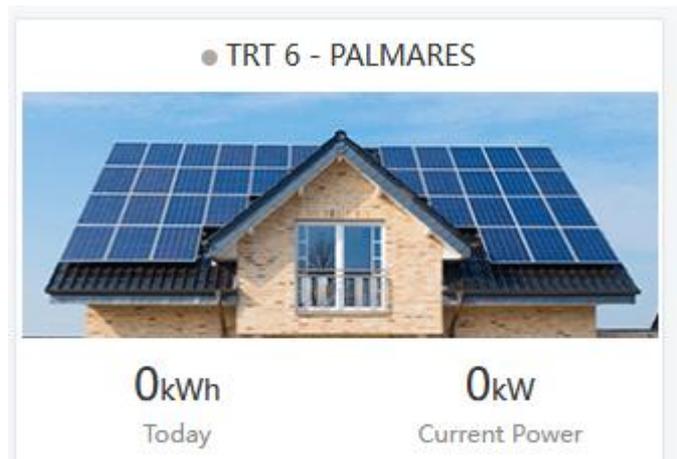


Figura 27 – Sistema de monitoramento de Palmares.

Não foi realizada a análise da geração pois o inversor não está conectado, posteriormente poderemos fazer uma análise de eficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O seguinte relatório de comissionamento possui o propósito de demonstrar os testes realizados em finalização e entrega de obra, afim de garantir a confiabilidade de energia entregue pelo sistema. Estes testes foram realizados na data de 16 de novembro de 2022, onde a engenheira Valesca Bettim Feltrin e o engenheiro Durval Soares da Silva Júnior, realizaram as inspeções do sistema in loco.


As inconformidades encontradas foram repassadas para a equipe de execução e a mesma já fez as alterações apontadas. No demais, a execução seguiu as informações e orientações apresentadas no projeto, não havendo nenhum tipo de alteração com relação ao projeto.



Valesca Bettim Feltrin

CPF: 030.365.120-20

Engenheira Responsável pelo Comissionamento in Loco



Luiz Alberto Wagner Pinto Junior

CPF: 991.465.250-68

Sócio proprietário/ Engenheiro Responsável
