

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | | Relatório nº | 27 | |
| | | | Data do relatório | 28/03/2025 | |
| | | | Dia da semana | Sexta-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | Contrato | 46/2024 | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 61 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 29 dias |


| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| Mão de obra (4) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Adeildo | Pedreiro | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Luis | Servente | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |


| Atividades (10) | | |
|---|---------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 64% - Em Andamento |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 62% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | 0 m² | 94% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.3 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | 5 m² | 100% - Concluída |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | 20.3 m² | 100% - Concluída |
| 3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.5 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 9.3 m² | 100% - Concluída |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 8.6 M | 81% - Em Andamento |

| Comentários (1) |
|--|
| Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:04 A Fiscalização observou que estava sendo realizado o serviço de instalação das soleiras no salão. |

| Fotos (8) |
|-----------|
|-----------|

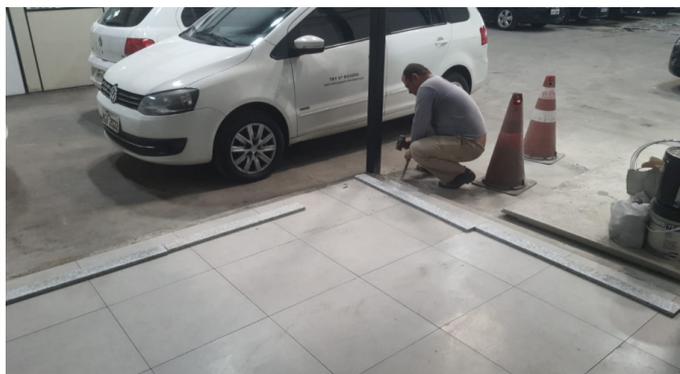

2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

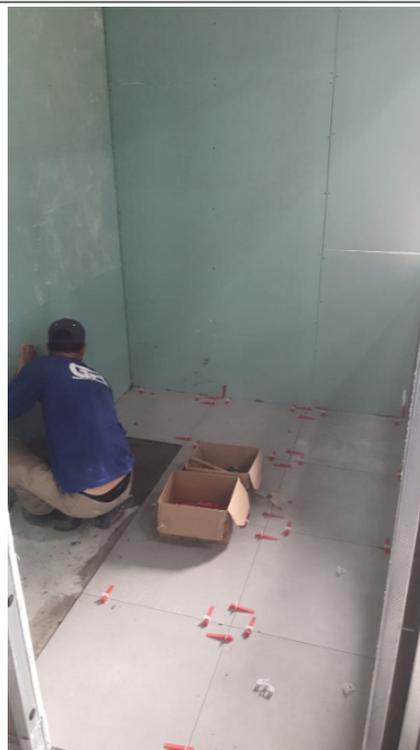

2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².



2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².



2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².



2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020



2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020



2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020



2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
|  | | Relatório nº | 1 | | |
| | | Data do relatório | 27/01/2025 | | |
| | | Dia da semana | Segunda-Feira | | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 46/2024 | | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 1 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 89 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---|-------------------|--------------------|----------|------------|
| Entrada / Saída | - | | Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Intervalo | - | | Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| Mão de obra (2) | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Ajudante | Servente de Obra | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 12:00 | | 05:00 | |

| Ocorrências (1) |
|---|
| ATIVIDADES NÃO INICIARAM POR CAUDA DA PRESENÇA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NO LOCAL DA OBRA |

| Fotos (2) | |
|---|--|
|  <p>ATIVIDADES NÃO INICIARAM POR CAUDA DA PRESENÇA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NO LOCAL DA OBRA</p> |  <p>ATIVIDADES NÃO INICIARAM POR CAUDA DA PRESENÇA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NO LOCAL DA OBRA</p> |

Assinatura

Assinatura

1 / 1

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|
|  | | | | Relatório nº | 2 |
| | | | | Data do relatório | 06/02/2025 |
| | | | | Dia da semana | Quinta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 46/2024 |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | | Prazo contratual | 90 dias |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | | Prazo decorrido | 11 dias |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 79 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | - | | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | - | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (3) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Ajudante | Servente de Obra | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 12:00 | | 05:00 | |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 12:00 | 01:00 | 04:00 | |

| Ocorrências (1) |
|--|
| ATIVIDADES PARALIZADAS DEVIDO À FALTA DE ENERGIA |
| Falta de energia Paralisação das Atividades |

| Fotos (4) | |
|--|--|
|  <p>ENTREGA DE MATERIAL</p> |  <p>ENTREGA DE MATERIAL</p> |



MARCAÇÃO DA ESTRUTURA



MARCAÇÃO DA ESTRUTURA

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|  | | | | Relatório nº | 5 |
| | | | | Data do relatório | 11/02/2025 |
| | | | | Dia da semana | Terça-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 46/2024 |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | | Prazo contratual | 90 dias |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | | Prazo decorrido | 16 dias |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 74 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 10:45 - 19:00 | 07:15 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (2) | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 13:00 - 16:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Equipe de alumetais | serralheiros | 10:45 - 19:00 | 01:00 | 07:15 | <i>Terceiros</i> |

| Atividades (4) | | |
|--|-------|--------------------|
| 3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL EM AÇO SAE, DIM 100X100 MM, E=2,00MM (#14) | 65 m | 81% - Em Andamento |
| 3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.3 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 20 m² | 66% - Em Andamento |
| 3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.3 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | 20 m² | 66% - Em Andamento |
| 3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.4 - COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | 80 M | 66% - Em Andamento |

| Fotos (3) | |
|--|---|
|  <p>3.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL EM AÇO SAE, DIM 100X100 MM, E=2,00MM (</p> |  <p>3.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL EM AÇO SAE, DIM 100X100 MM, E=2,00MM (</p> |



3.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL EM AÇO SAE, DIM 100X100 MM, E=2,00MM (

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|  | | | | Relatório nº | 6 |
| | | | | Data do relatório | 14/02/2025 |
| | | | | Dia da semana | Sexta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 46/2024 |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | | Prazo contratual | 90 dias |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | | Prazo decorrido | 19 dias |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 71 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (2) | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 13:00 - 16:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Ajudante | Servente de Obra | 09:00 - 17:00 | 01:00 | 07:00 | |

| Atividades (4) | | | |
|--|--|------|--------------------|
| 3 - ESTRUTURA METÁLICA | | | |
| 3.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL EM AÇO SAE, DIM 100X100 MM, E=2,00MM (#14) | | 0 m | 81% - Em Andamento |
| 3 - ESTRUTURA METÁLICA | | | |
| 3.3 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | 0 m² | 66% - Em Andamento |
| 3 - ESTRUTURA METÁLICA | | | |
| 3.3 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | | 0 m² | 66% - Em Andamento |
| 3 - ESTRUTURA METÁLICA | | | |
| 3.4 - COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | | 0 M | 66% - Em Andamento |

| Fotos (5) | |
|---|--|
|  |  |
| ENTREGA DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS DIVISÓRIAS | ENTREGA DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS DIVISÓRIAS |



ENTREGA DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS DIVISÓRIAS



ENTREGA DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS DIVISÓRIAS



ENTREGA DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS DIVISÓRIAS

Assinatura

Assinatura

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|  | | | | Relatório nº | 12 | |
| | | | | Data do relatório | 21/02/2025 | |
| | | | | Dia da semana | Sexta-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 46/2024 | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | | Prazo decorrido | 26 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 64 dias | |
| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | | Condição climática | Tempo | Condição |
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |
| Mão de obra (1) | | | | | | |
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | | |
| Wilkson | Engenheiro | 11:00 - 14:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> | |
| Atividades (2) | | | | | | |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | |
| 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | 0 H | 25% - Em Andamento | |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | |
| 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | 0 H | 25% - Em Andamento | |
| Ocorrências (1) | | | | | | |
| FOI ENTREGUE À CONSTRUTORA A "PRANCHA 03" CONTENDO DETALHES ARQUITETÔNICOS DA OBRA | | | | | | |
| Anexos (1) | | | | | | |
| PRANCHA 03.pdf | | | | | 240 KB | |

Assinatura

Assinatura


1 / 1

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|  | | | | Relatório nº | 13 |
| | | | | Data do relatório | 25/02/2025 |
| | | | | Dia da semana | Terça-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 46/2024 |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | | Prazo contratual | 90 dias |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | | Prazo decorrido | 30 dias |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 60 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (1) | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|--------------------|--|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | | |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 13:00 - 17:00 | 01:00 | 03:00 | Mão de Obra Direta | |

| Atividades (5) | | | |
|--|--------|--------------------|--|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento | |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento | |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 30 M | 49% - Em Andamento | |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 1 UN | 50% - Em Andamento | |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 1.5 UN | 50% - Em Andamento | |
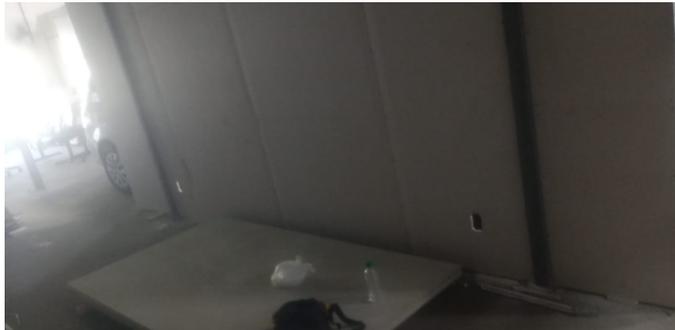
| Fotos (6) | |
|---|--|
|  |  |



Vídeos (1)

[Vídeo 1 \(visualizar\).mp4](#)

00:15

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | Relatório n° | 14 | | |
| | | Data do relatório | 26/02/2025 | | |
| | | Dia da semana | Quarta-Feira | | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 46/2024 | | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 31 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 59 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (1) | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | Mão de Obra Direta |

| Atividades (5) | | |
|--|------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |

| Ocorrências (1) |
|---|
| - O TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO QUESTIONOU ALGUNS PONTOS: Como será o encaminhamento dos drenos? Onde está no contrato a estrutura pasa a condensadora? |

| Fotos (1) |
|-----------|
| |



- O TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO QUESTIONOU ALGUNS PONTOS: Como será o encaminhamento dos drenos? Onde está no contrato a estrutura para a condensadora?

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
|  | | Relatório nº | 16 | | |
| | | Data do relatório | 10/03/2025 | | |
| | | Dia da semana | Segunda-Feira | | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 46/2024 | | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 43 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 47 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |


| Mão de obra (1) | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |

| Atividades (6) | | |
|---|------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.14 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 1 m² | 1% - Em Andamento |

| Fotos (5) |
|-----------|
|-----------|



2.14 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

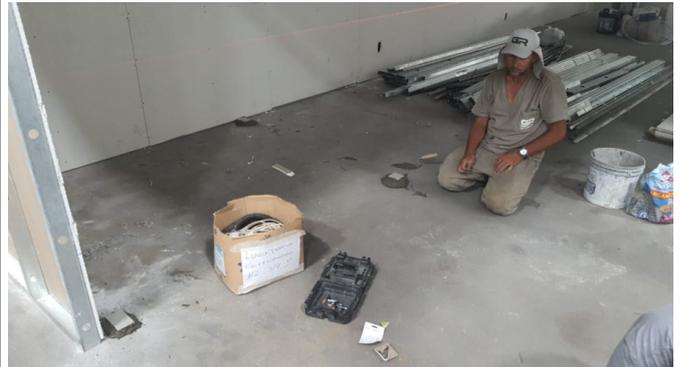

2.14 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021



2.14 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021



2.14 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021



2.14 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | | Relatório n° | 18 | |
| | | | Data do relatório | 12/03/2025 | |
| | | | Dia da semana | Quarta-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | Contrato | 46/2024 | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 45 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 45 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (4) | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Adeildo | Pedreiro | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Luis | Servente | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Equipe de serralharia | Serralheiros | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | <i>Terceiros</i> |

| Atividades (5) | | |
|--|------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |

| Fotos (2) |
|-----------|
|-----------|



Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | | Relatório n° | 19 | |
| | | | Data do relatório | 13/03/2025 | |
| | | | Dia da semana | Quinta-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | Contrato | 46/2024 | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 46 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 44 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (4) | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Adeildo | Pedreiro | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Luis | Servente | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Equipe de serralharia | Serralheiros | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | <i>Terceiros</i> |

| Atividades (5) | | |
|--|------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |

| Fotos (1) |
|-----------|
|-----------|



ENTREGA DO MATERIAL DRYWALL RU DA GUARRITA

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | Relatório nº | 21 | | |
| | | Data do relatório | 17/03/2025 | | |
| | | Dia da semana | Segunda-Feira | | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 46/2024 | | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 50 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 40 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (4) | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Adeildo | Pedreiro | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Luis | Servente | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Equipe de serralharia | Serralheiros | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | <i>Terceiros</i> |

| Atividades (8) | | |
|---|--------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 25% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | 15 m² | 94% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.3 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | 6.9 m² | 57% - Em Andamento |
| 4 - TELHADO 4.3 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | 4.9 m² | 100% - Concluída |

| Fotos (2) |
|-----------|
|-----------|



4.3 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO CAPA) = (8 3). AF_11/2020_PA



2.3 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM...

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | Relatório nº | 24 | | |
| | | Data do relatório | 24/03/2025 | | |
| | | Dia da semana | Segunda-Feira | | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 46/2024 | | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 57 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 33 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (4) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Adeildo | Pedreiro | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Luis | Servente | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |

| Atividades (8) | | |
|---|------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 53% - Em Andamento |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 50% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | 0 m² | 94% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.3 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | 0 m² | 57% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.1.3 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | 0 m² | 29% - Em Andamento |

| Ocorrências (1) |
|---|
| O REVESTIMENTO TEVE QUE SER RETIRADO E REASSENTADO PARA SEGUIR A PAGINAÇÃO DO PROJETO |

| Comentários (1) |
|--|
| Fiscalização TRT6 13/05/2025 08:41 No dia 20 de março a Fiscalização identificou uma falha no alinhamento do assentamento das primeiras placas de porcelanato e solicitou o ajuste. Neste dia 24, as placas estavam sendo retiradas para ser feita a correção. |

Assinatura

Assinatura

1 / 1

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | | Relatório nº | 25 | |
| | | | Data do relatório | 26/03/2025 | |
| | | | Dia da semana | Quarta-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | Contrato | 46/2024 | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 59 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 31 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (4) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Adeildo | Pedreiro | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Luis | Servente | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |

| Atividades (8) | | |
|---|------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 H | 64% - Em Andamento |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 H | 62% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | 0 m² | 94% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.3 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | 0 m² | 57% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.1.3 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | 5 m² | 39% - Em Andamento |

| Comentários (1) |
|--|
| Fiscalização TRT6 13/05/2025 08:58 No dia 25 de março foi reiniciado o serviço de assentamento do porcelanato, com as correções indicadas pela Fiscalização. |

| Fotos (3) |
|-----------|
|-----------|



Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | | Relatório nº | 26 | |
| | | | Data do relatório | 27/03/2025 | |
| | | | Dia da semana | Quinta-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | Contrato | 46/2024 | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 60 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 30 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| Mão de obra (4) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Adeildo | Pedreiro | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Luis | Servente | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |

| Atividades (9) | | |
|---|-------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 64% - Em Andamento |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 62% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | 0 m² | 94% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.3 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | 0 m² | 57% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.1.3 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | 10 m² | 59% - Em Andamento |
| 3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.5 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 21 m² | 69% - Em Andamento |

| Comentários (1) |
|---|
| Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:00 Na data de hoje a Fiscalização observou que foi dada continuidade ao assentamento do porcelanato e realizado serviço de pintura na estrutura metálica. |

| Fotos (4) |
|-----------|
| |



2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².



2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².



2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².



3.5 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | | Relatório nº | 28 | |
| | | | Data do relatório | 31/03/2025 | |
| | | | Dia da semana | Segunda-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | Contrato | 46/2024 | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 64 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 26 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (4) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Adeildo | Pedreiro | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Luis | Servente | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |

| Atividades (8) | | |
|--|--------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 64% - Em Andamento |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 62% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | 2.6 m² | 100% - Concluída |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 0 M | 81% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO EUCATEX, MODELO N4 (PAINEL/VIDRO/VIDRO) COM PERFIL DE AÇO | 20 m² | 79% - Em Andamento |

| Fotos (5) |
|-----------|
|-----------|



2.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO EUCATEX, MODELO N4 (PAINEL/VIDRO/VIDRO) COM PERFIL DE AÇO



2.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO EUCATEX, MODELO N4 (PAINEL/VIDRO/VIDRO) COM PERFIL DE AÇO



2.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO EUCATEX, MODELO N4 (PAINEL/VIDRO/VIDRO) COM PERFIL DE AÇO



2.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO EUCATEX, MODELO N4 (PAINEL/VIDRO/VIDRO) COM PERFIL DE AÇO



2.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO EUCATEX, MODELO N4 (PAINEL/VIDRO/VIDRO) COM PERFIL DE AÇO

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | | Relatório nº | 30 | |
| | | | Data do relatório | 02/04/2025 | |
| | | | Dia da semana | Quarta-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | Contrato | 46/2024 | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 66 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 24 dias |


| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |


| Mão de obra (4) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Adeildo | Pedreiro | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Luis | Servente | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |

| Atividades (9) | | |
|--|-------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 H | 87% - Em Andamento |
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 H | 100% - Concluída |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 0 M | 81% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.8 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 187 M | 100% - Concluída |
| 4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLS, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 UN | 50% - Em Andamento |

| Comentários (1) |
|--|
| Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:08 Foi observado pela Fiscalização que foi concluído o serviço de assentamento das placas de porcelanato. Há de se registrar que algumas placas apresentam tonalidade de cor diferente das demais. Trata-se de 17 (dezesete) placas - cerca de 5,7m². A Fiscalização questionou o Encarregado da Obra quanto a essa diferença. O mesmo informou que trata-se de mesmo modelo de porcelanato em todo o salão, variando-se o lote de fabricação. A Fiscalização verificou as caixas de porcelanato e realmente trata-se de mesma marca e modelo. Ainda assim, solicitamos verificar a possibilidade de efetuar o ajuste. |

| Fotos (5) |
|-----------|
|-----------|

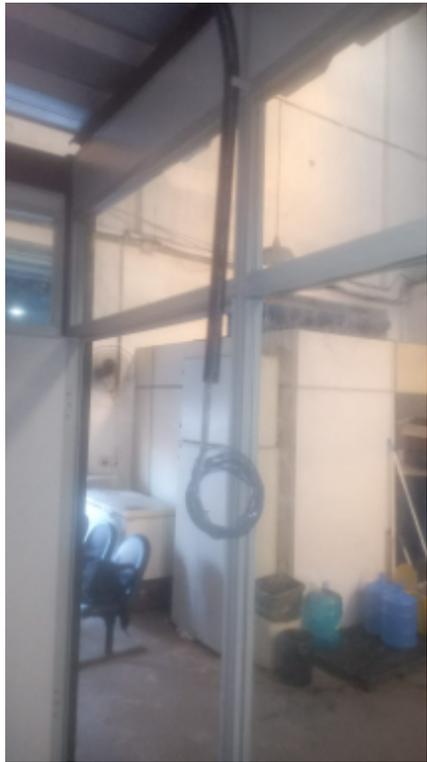

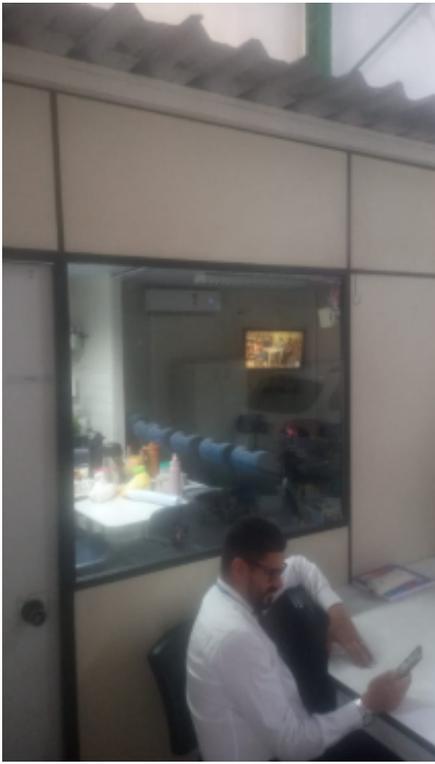

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | | Relatório nº | 31 | |
| | | | Data do relatório | 03/04/2025 | |
| | | | Dia da semana | Quinta-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | Contrato | 46/2024 | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 67 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 23 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (4) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Adeildo | Pedreiro | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Luis | Servente | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |

| Atividades (7) | | |
|--|------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 87% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 0 M | 81% - Em Andamento |
| 4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 UN | 50% - Em Andamento |

| Comentários (1) | |
|---|--|
| Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:12 | A Fiscalização observou que foi instalado no local (sem montagem de disjuntores), o quadro elétrico do salão, e os cabos elétricos foram lançados até o quadro. Também estava sendo realizado serviço de rejuntamento do piso. |

| Fotos (4) |
|-----------|
| |



ABERTURA DA JANELA NA GUARITA



ABERTURA DA JANELA NA GUARITA



CONTINUAÇÃO PASSAGEM DOS CABOS



APLICAÇÃO DE REJUNTE

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | | Relatório nº | 32 | |
| | | | Data do relatório | 04/04/2025 | |
| | | | Dia da semana | Sexta-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | Contrato | 46/2024 | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 68 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 22 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (3) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Equipe de forro | Gesseiro | - | | | <i>Terceiros</i> |

| Atividades (9) | | |
|--|-------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 87% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 0 M | 81% - Em Andamento |
| 4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.1 - PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR | 2 Un | 100% - Concluída |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.10 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 40 m² | 79% - Em Andamento |

| Fotos (1) |
|-----------|
| |



REFORÇO PARA EVAPORADORAS

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | Relatório nº | 33 | | |
| | | Data do relatório | 07/04/2025 | | |
| | | Dia da semana | Segunda-Feira | | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 46/2024 | | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 71 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 19 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (3) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Equipe de forro | Gesseiro | - | | | <i>Terceiros</i> |

| Atividades (8) | | |
|--|------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 87% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 0 M | 81% - Em Andamento |
| 4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.10 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 0 m² | 79% - Em Andamento |

| Ocorrências (1) |
|---------------------------------|
| DIA DE REUNIÃO COM FISCALIZAÇÃO |

| Comentários (1) |
|--|
| Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:18 A Fiscalização indicou ajustes a serem realizados para um melhor acabamento, tratou sobre a importância de atendimento do prazo contratual e esclareceu algumas poucas dúvidas de equipe da Contratada. |

Assinatura

Assinatura

1 / 1

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|  | | | | Relatório n° | 34 |
| | | | | Data do relatório | 08/04/2025 |
| | | | | Dia da semana | Terça-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | | Contrato | 46/2024 |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | | Prazo contratual | 90 dias |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | | Prazo decorrido | 72 dias |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 18 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (3) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Equipe de forro | Gesseiro | - | | | <i>Terceiros</i> |

| Atividades (8) | | |
|--|------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 87% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 0 M | 81% - Em Andamento |
| 4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.10 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 0 m² | 79% - Em Andamento |

Assinatura

Assinatura

1 / 1

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | | Relatório nº | 35 | |
| | | | Data do relatório | 10/04/2025 | |
| | | | Dia da semana | Quinta-Feira | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | | Contrato | 46/2024 | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 74 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 16 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (3) | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Equipe de forro | Gesseiro | - | | | <i>Terceiros</i> |

| Atividades (10) | | |
|--|-------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 87% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 0 M | 81% - Em Andamento |
| 4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.10 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.7 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 98 m² | 81% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.11 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 40 m² | 79% - Em Andamento |

| Comentários (1) |
|---|
| Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:21 No dia 09 de abril estava sendo realizado o serviço de aplicação de telas antifissuras nas emendas das placas de gesso e emassamento de paredes internas e teto. |

| Fotos (5) |
|-----------|
|-----------|



2.7 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023



2.11 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023



2.11 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023



2.11 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023



2.11 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | Relatório nº | 36 | | |
| | | Data do relatório | 11/04/2025 | | |
| | | Dia da semana | Sexta-Feira | | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 46/2024 | | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 75 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 15 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀️ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀️ Claro | Praticável |

| Mão de obra (3) | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Equipe de pintura | pintores | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |

| Atividades (10) | | |
|--|------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 87% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 0 M | 81% - Em Andamento |
| 4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.10 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.7 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 0 m² | 81% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.11 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 0 m² | 79% - Em Andamento |

| Comentários (1) | |
|---|--|
| Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:24 A Fiscalização observou que estava em andamento o serviço de emassamento de paredes e tetos. | |

| Vídeos (1) | |
|--|-------|
| Vídeo 1 (visualizar).mp4 | 00:25 |

Assinatura

Assinatura

1 / 1

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
|  | | Relatório nº | 37 | | |
| | | Data do relatório | 14/04/2025 | | |
| | | Dia da semana | Segunda-Feira | | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 46/2024 | | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 78 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 12 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (3) | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Equipe de pintura | pintores | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |

| Atividades (10) | | |
|--|---------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 H | 87% - Em Andamento |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 0 M | 81% - Em Andamento |
| 4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.10 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.7 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 10 m² | 89% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.11 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 10.3 m² | 100% - Concluída |

| Fotos (1) |
|-----------|
|-----------|



2.7 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Assinatura

Assinatura

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------|---------|
|  | | Relatório nº | 38 | | |
| | | Data do relatório | 15/04/2025 | | |
| | | Dia da semana | Terça-Feira | | |
| Relatório Diário de Obra (RDO) | | Contrato | 46/2024 | | |
| Obra | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025 | | Prazo contratual | 90 dias | |
| Local | Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE | | Prazo decorrido | 79 dias | |
| Contratante | TRT6 | Responsável | Engª Micheline Gomes | Prazo a vencer | 11 dias |

| Horário de trabalho | | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo | Condição |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| Entrada / Saída | 09:00 - 17:00 | 07:00 | Manhã | ☀ Claro | Praticável |
| Intervalo | 12:00 - 13:00 | | Tarde | ☀ Claro | Praticável |

| Mão de obra (3) | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| Nome | Função | Entrada / Saída | Intervalo | Horas | |
| Wilkson | Engenheiro | 07:00 - 10:00 | | 03:00 | <i>Mão de Obra Direta</i> |
| Revenilson Silva | Encarregado de elétrica | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |
| Equipe de pintura | pintores | 07:00 - 17:00 | 01:00 | 09:00 | |

| Atividades (9) | | |
|--|---------|--------------------|
| 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 11 H | 100% - Concluída |
| 5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0 M | 49% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i> | 0 UN | 50% - Em Andamento |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 2 M | 100% - Concluída |
| 4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | 0 m² | 79% - Em Andamento |
| 5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 UN | 100% - Concluída |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.10 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 10.3 m² | 100% - Concluída |
| 2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.7 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 12.4 m² | 100% - Concluída |

| Comentários (1) | |
|---|---|
| Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:29 | Foi verificada pela fiscalização a continuidade da montagem do quadro elétrico do salão e início da montagem do forro da guarita. |

| Fotos (2) |
|-----------|
| |



Assinatura

Assinatura
