

				Relatório nº	39
				Data do relatório	16/04/2025
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	80 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	10 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (10)		
5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 M	49% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	0 m²	79% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.9 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	Não Iniciada
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.12 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	Não Iniciada
5.4 - AR CONDICIONADO 5.4.3 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	12 M	100% - Concluída
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.2 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	93 M	100% - Concluída
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.6 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	2 UN	100% - Concluída
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.7 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	2 UN	100% - Concluída

Fotos (1)



5.1.6 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	40
				Data do relatório	17/04/2025
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	81 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	9 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (6)		
5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20 M	81% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	0 m²	79% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.9 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	10 m²	8% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.12 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	Não Iniciada

Fotos (2)



INSTALAÇÃO DAS SOLEIRAS



INSTALAÇÃO DAS SOLEIRAS

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	41
				Data do relatório	19/04/2025
				Dia da semana	Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	83 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	7 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (6)		
5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 M	81% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	0 m²	79% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.9 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	8% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.12 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	Não Iniciada

Fotos (2)



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	42
				Data do relatório	22/04/2025
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	86 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	4 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (6)		
5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 M	81% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	0 m²	79% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.9 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	8% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.12 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	Não Iniciada

Comentários (1)
Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:36 Foram verificados pela Fiscalização serviços de pintura e de instalações elétricas.

Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:14
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:11

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	43
				Data do relatório	23/04/2025
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	87 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	3 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Ajudante	Servente de Obra	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (10)		
5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	11 M	100% - Concluída
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	0 m²	79% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.9 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	84 m²	78% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.12 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	40 m²	79% - Em Andamento
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.1 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 M	Não Iniciada
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.3 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0 UN	Não Iniciada
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.4 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0 UN	Não Iniciada
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.8 - Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm	0 un	Não Iniciada

Comentários (1)	
Fiscalização TRT6	13/05/2025 09:39
A Fiscalização verificou a continuidade dos serviços de instalações elétricas e pintura.	

Fotos (5)



	
---	--

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	44
				Data do relatório	24/04/2025
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	88 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	2 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Ajudante	Servente de Obra	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (9)		
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i>	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i>	0 UN	50% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	0 m²	79% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.9 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	8 m²	84% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.12 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	79% - Em Andamento
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.1 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100 M	42% - Em Andamento
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.3 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0 UN	Não Iniciada
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.4 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0 UN	Não Iniciada
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.8 - Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm	0 un	Não Iniciada

Fotos (4)	
	



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	45
				Data do relatório	25/04/2025
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	1 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Ajudante	Servente de Obra	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (11)		
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	0 m²	79% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.9 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	84% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.12 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	79% - Em Andamento
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.1 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	134 M	100% - Concluída
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS 5.1.8 - Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm	5 un	100% - Concluída
5.2 - ELÉTRICA 5.2.4 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.5 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1 UN	33% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.6 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1 UN	100% - Concluída

Comentários (1)	
Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:42 Foi verificado pela Fiscalização a realização de serviços de instalações elétricas, de lógica e pintura.	

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	46
				Data do relatório	26/04/2025
				Dia da semana	Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	90 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	0 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Ajudante	Servente de Obra	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (9)		
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i>	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i>	0 UN	50% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	0 m²	79% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.9 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	84% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.12 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0 m²	79% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.4 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.5 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 UN	33% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.6 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 UN	50% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.5 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4.9 m²	100% - Concluída

Fotos (2)



2.5 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INST...



2.5 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INST...

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	47
				Data do relatório	28/04/2025
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	90 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	0 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Ajudante	Servente de Obra	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (14)		
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i>	1 UN	100% - Concluída
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 <i>proporcional à infra</i>	1.5 UN	100% - Concluída
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	10.6 m²	100% - Concluída
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.9 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	18.4 m²	100% - Concluída
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.12 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	10.3 m²	100% - Concluída
5.2 - ELÉTRICA 5.2.4 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1 UN	100% - Concluída
5.2 - ELÉTRICA 5.2.5 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2 UN	100% - Concluída
5.2 - ELÉTRICA 5.2.6 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1 UN	100% - Concluída
6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.1 - LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	0 m²	Não Iniciada
5.4 - AR CONDICIONADO 5.4.5 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	68.2 m	100% - Concluída
5.4 - AR CONDICIONADO 5.4.6 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	78.3 M	100% - Concluída
5.3 - LÓGICA 5.3.1 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	470 M	100% - Concluída
5.3 - LÓGICA 5.3.2 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	8 UN	100% - Concluída
5.3 - LÓGICA 5.3.3 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	47.3 M	100% - Concluída

Ocorrências (1)
NESTE DIA FOI ENVIADO UM OFICIO DE ENTREGA DA OBRA

Comentários (1)	
Fiscalização TRT6	13/05/2025 08:22
A Fiscalização confirma o recebimento do ofício de conclusão da obra. A Fiscalização informa que foi realizada vistoria com o Engenheiro Wilkson, onde foram indicadas as pendências a serem sanadas: Retoques de pintura na guarita e salão, aplicar rejuntamento da soleira da guarita, melhorar acabamento das quinas externas da guarita, melhorar acabamento nas paredes externas da guarita (partes inferiores), instalar as tampas dos condutores, ajustar a porta da guarita e identificar os cabos UTP.	

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	48
				Data do relatório	02/05/2025
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	90 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	0 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Ajudante	Servente de Obra	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (7)		
6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1 - LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	50.3 m²	100% - Concluída
RETOQUES E ACABAMENTOS		81% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA		
2.8 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1.7 m²	100% - Concluída
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS		
5.1.3 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	14 UN	100% - Concluída
5.1 - ENTRE QUADROS ELÉTRICOS		
5.1.4 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1 UN	100% - Concluída
5.2 - ELÉTRICA		
5.2.1 - LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, ADAPTÁVEL À MODULAÇÃO DO FORRO DE GESSO DE 62X62, INCLUSO 4 LÂMPADAS TUBULARES T8	8 UN	100% - Concluída
5.2 - ELÉTRICA		
5.2.2 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	1 UN	100% - Concluída

Comentários (1)	
Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:46	
A Fiscalização verificou que a Contratada estava realizando as correções das pendências indicadas.	

Fotos (4)	
	



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	49
				Data do relatório	03/05/2025
				Dia da semana	Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	90 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	0 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Ajudante	Servente de Obra	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (1)	
RETOQUES E ACABAMENTOS	81% - Em Andamento

Comentários (1)	
Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:47 A Contratada estava realizando retoques e acabamentos.	

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	50
				Data do relatório	12/05/2025
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	90 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	0 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de pintura	pintores	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Ajudante	Servente de Obra	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (1)	
RETOQUES E ACABAMENTOS	100% - Concluída

Comentários (1)	
Wilkson 19/05/2025 09:27 nesta data foi emitido o Termo de Recebimento Definitivo.	

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	3
				Data do relatório	07/02/2025
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	12 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	78 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	-		Manhã	☀ Claro	Impraticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Impraticável

Mão de obra (3)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	Mão de Obra Direta
Ajudante	Servente de Obra	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 12:00		05:00	
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 12:00	01:00	04:00	

Ocorrências (1)	
UNIDADE AINDDA SEM ENERGIA	
Paralisação das Atividades	

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	4
				Data do relatório	10/02/2025
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	15 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	75 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	-		Manhã	☀ Claro	Impraticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Impraticável

Mão de obra (3)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	Mão de Obra Direta
Ajudante	Servente de Obra	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 12:00		05:00	
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 12:00	01:00	04:00	

Ocorrências (2)	
AGUARDANDO RETORNO SOBRE ENERGIA	
Horas Improdutivas	
TIVEMOS RETORNO ÀS 7H31. DESSA FORMA, REPROGRAMAMOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PARA O DIA POSTERIOR.	
Horas Improdutivas Sem Atividades	

Assinatura

Assinatura


				Relatório nº	7
				Data do relatório	15/02/2025
				Dia da semana	Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	20 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	70 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (2)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	08:00 - 09:30		01:30	Mão de Obra Direta
Equipe da Perfil	Montadores	08:00 - 15:00	01:00	06:00	Terceiros

Atividades (7)		
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL EM AÇO SAE, DIM 100X100 MM, E=2,00MM (#14)	0 m	81% - Em Andamento
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.3 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	0 m²	66% - Em Andamento
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.3 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	0 m²	66% - Em Andamento
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.4 - COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	0 M	66% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.1 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	40 m²	79% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	40 m²	79% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	34 m²	65% - Em Andamento

Fotos (3)

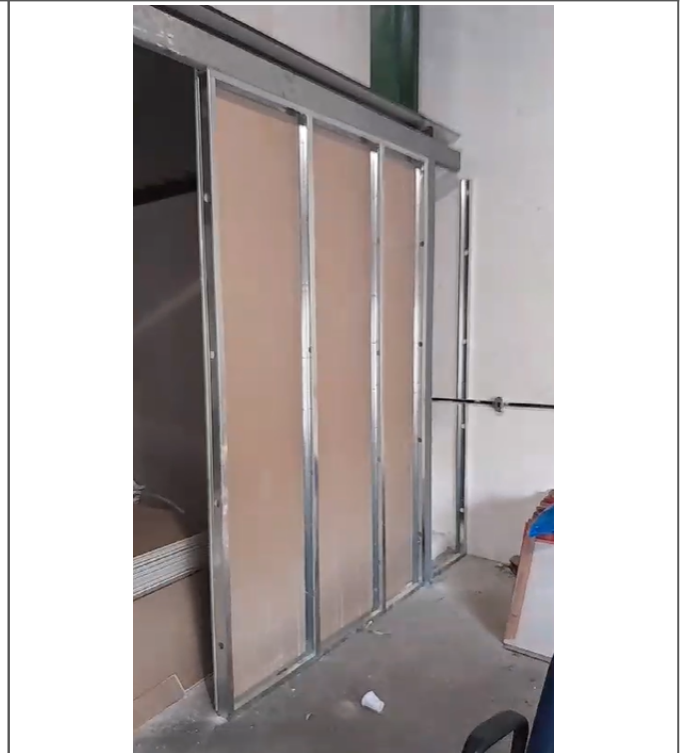 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:28

				Relatório nº	8
				Data do relatório	17/02/2025
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	22 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	68 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (2)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	08:00 - 09:30		01:30	Mão de Obra Direta
Marcos Paulo da Silva	Encarregado Eletricista	08:00 - 09:30	00:00	01:30	

Atividades (7)		
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL EM AÇO SAE, DIM 100X100 MM, E=2,00MM (#14)	0 m	81% - Em Andamento
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.3 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	0 m²	66% - Em Andamento
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.3 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	0 m²	66% - Em Andamento
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.4 - COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	0 M	66% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.1 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	0 m²	79% - Em Andamento
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	0 m²	79% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	0 m²	65% - Em Andamento

Ocorrências (2)
FOI REALIZADA UMA REUNIAO COM A FISCALIZAÇÃO PARA TIRAR DÚVIDAS SOBRE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Sem Atividades
A ENG. RESPONSÁVEL TAMBÉM QUESTIONOU SOBRE O FORRO DA SALA DE REUNIAO. POIS O ESPECIFICADO NA PLANILHA NÃO É O IDEAL PARA A ESTRUTURA.

Assinatura

Assinatura


				Relatório nº	9
				Data do relatório	18/02/2025
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	23 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	67 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (2)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	08:00 - 09:30		01:30	Mão de Obra Direta
Marcos Paulo da Silva	Encarregado Eletricista	08:00 - 09:30	00:00	01:30	

Atividades (7)		
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL EM AÇO SAE, DIM 100X100 MM, E=2,00MM (#14)	14.6 m	100% - Concluída
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.3 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	10.3 m²	100% - Concluída
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.3 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	10.3 m²	100% - Concluída
3 - ESTRUTURA METÁLICA 3.4 - COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	39.5 M	100% - Concluída
4 - TELHADO 4.1 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	10.6 m²	100% - Concluída
4 - TELHADO 4.2 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	0 m²	79% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	0 m²	65% - Em Andamento

Fotos (4)

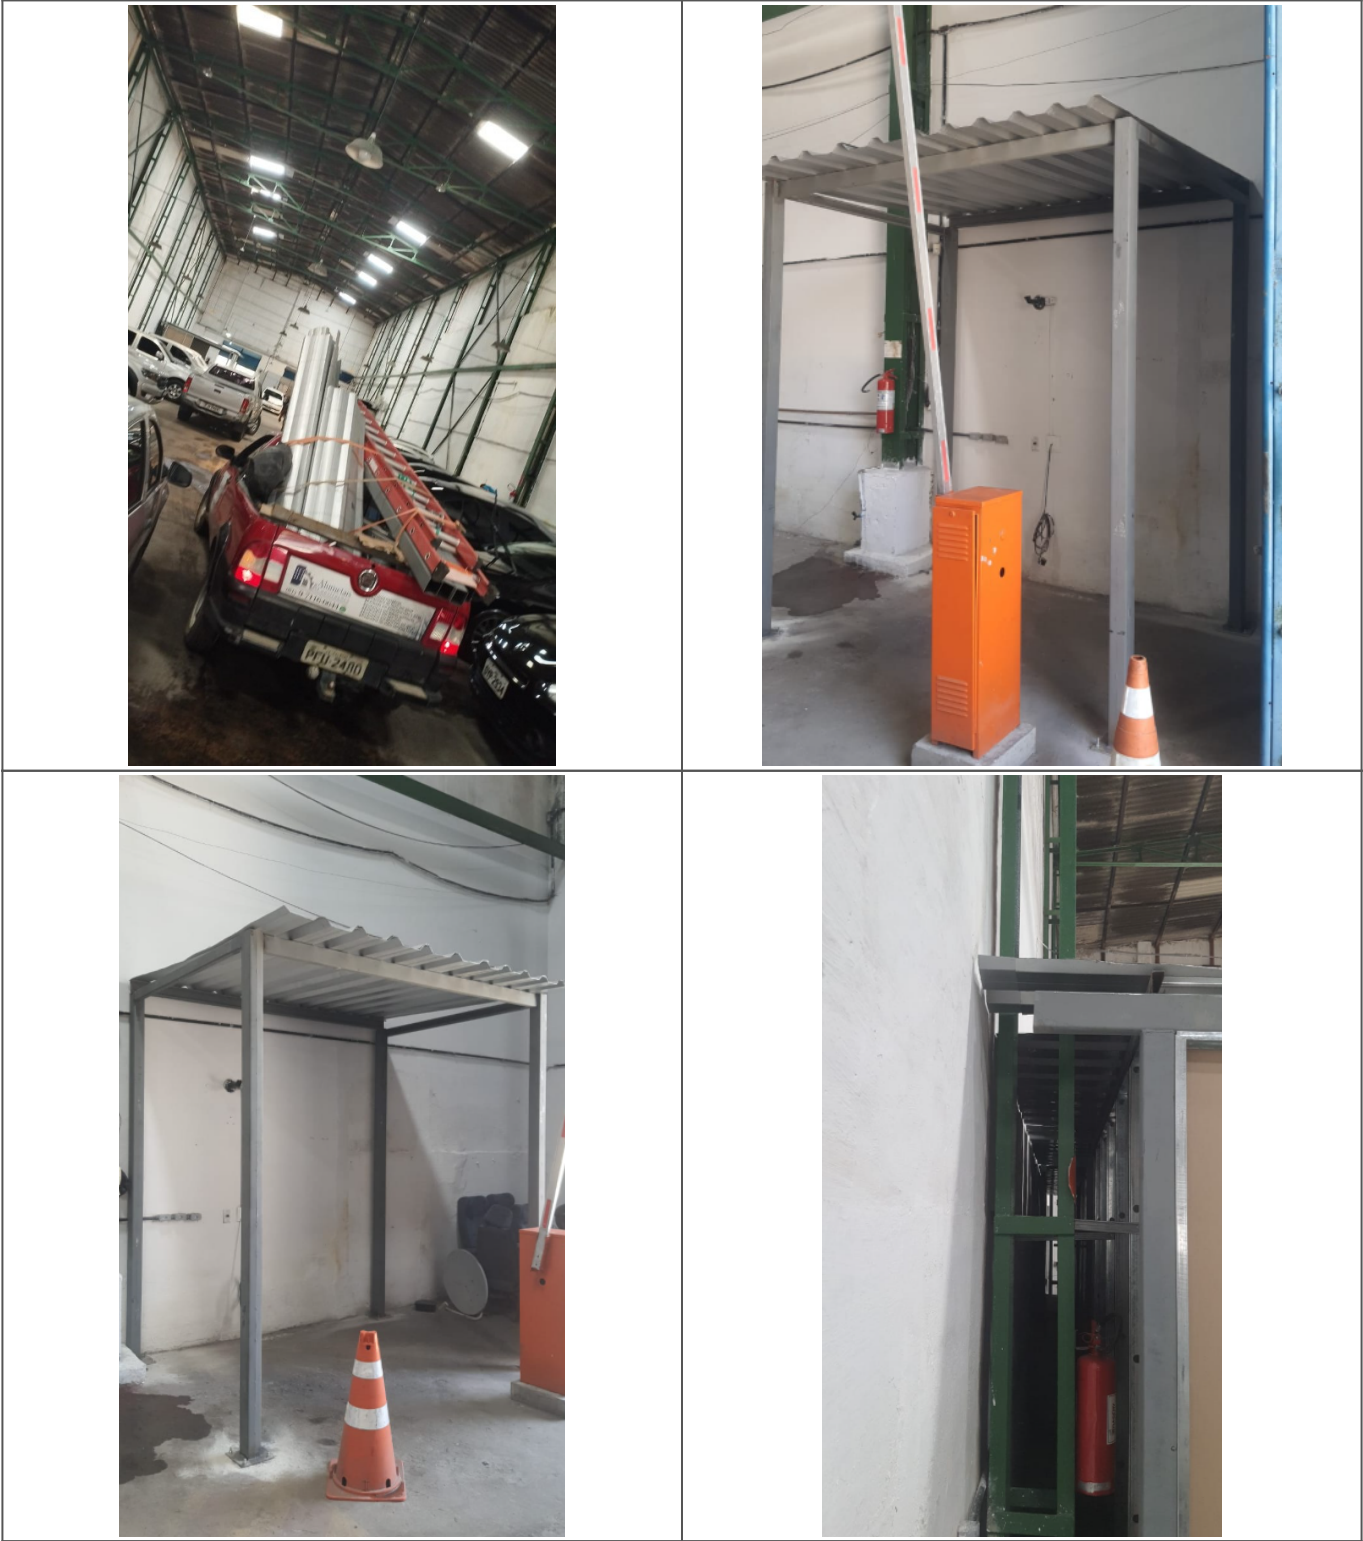

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	10
				Data do relatório	19/02/2025
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	24 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	66 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (2)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	11:00 - 14:00		03:00	Mão de Obra Direta
Micheline Gomes Romão de Miranda Valença	Engenheira Civil	11:00 - 14:00	00:00	03:00	Mão de Obra Indireta

Atividades (2)		
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22 H	25% - Em Andamento
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4 H	25% - Em Andamento

Ocorrências (2)
DIA DE REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DE ALGUMAS ATIVIDADES
DEFINIMOS QUE:
- O DRYWALL SERÁ CONSTRUÍDO EM CIMA DO REVESTIMENTO (NÃO TINHA ESSE DETALHE NO PROJETO)
- TEREMOS MUDANÇA NO LAYOUT DAS DIVISÓRIAS DEVIDO A UMA MUDANÇA NA ESTRUTURA
- NÃO TEREMOS LAJE NA GUARITA

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	11
				Data do relatório	20/02/2025
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	25 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	65 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	11:00 - 14:00		03:00	Mão de Obra Direta
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	14:00 - 17:00	00:00	03:00	
Micheline Gomes Romão de Miranda Valença	Engenheira Civil	11:00 - 14:00	00:00	03:00	Mão de Obra Indireta

Atividades (3)		
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	25% - Em Andamento
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	25% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.2 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	15 M	100% - Concluída

Ocorrências (1)
- NO DIA FORAM LEVANTADAS DÚVIDAS SOBRE A PAGINAÇÃO DAS SALAS - DIANTE DAS DÚVIDAS, PARA NÃO REALIZAR ATIVIDADES "ERRADAS" OS SERVIÇOS FORAM PARALIZADOS ATÉ DEFINIÇÕES.
Inconsistência encontrada em projeto Paralisação das Atividades

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	00:28

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	15
				Data do relatório	07/03/2025
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	40 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	50 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (1)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta

Atividades (5)		
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	25% - Em Andamento
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	25% - Em Andamento
5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 M	49% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento

Ocorrências (1)

Na visita na obra realizada dia 07/03 às 11h00 onde estavam presentes Wilkson (engenheiro), Revenilson (Eletricista), Durval (Fiscal) e Flávio (fiscal) foram definidos os seguintes pontos:

Guarita

- A paginação vai seguir o projeto (iniciando na face interna do drywall). A divisória Drywall ficará sobre o contrapiso.
- Será necessário um ajuste na estrutura da guarita para execução da laje, pois as terças foram posicionadas de forma a dar declividade à telha. A laje não ficará inclinada.
- Não teremos impermeabilização ou dreno na laje, pois não consta no projeto e na planilha.
- Daremos 1% de declividade na argamassa de cobrimento da face superior da laje. A água será direcionada para a lateral esquerda da guarita.
- O dreno a condensadora será encaminhado para o lado de fora do galpão (de frente para a avenida).
- A haste de aterramento será posicionada em um local próximo ao quadro, no ponto mais conveniente.
- A construtora deixará os pontos da condensadora no lado externo direito da guarita a 1,80m de altura do piso para a manutenção do TRT realizar a montagem da estrutura e instalação do equipamento.
- Como não consta em projeto nem na memória de cálculo a execução da parede drywall de face com a parede de alvenaria existente, cabe à construtora definir se prefere rasgar a alvenaria existente do galpão ou realizar o fechamento em drywall para cobrir as instalações.

Sala de Reunião

- Será utilizado eletroduto rígido somente sobre o forro. Dentro das divisórias será eletroduto flexível.
- O contrapiso interno terá que ser realizado para nivelar o piso. Devido às irregularidades do piso não será possível nivelar pela argamassa.
- A construtora deverá encaminhar a especificação da telha instalada para provar ser pré-pintada com pintura termostática.
- O dreno das condensadoras será encaminhado para o lado de fora do galpão (de frente para os fundos).
- * A haste de aterramento será posicionada em um local próximo ao quadro, no ponto mais conveniente.
- * A construtora deixará os pontos da condensadora no lado externo direito da sala a 1,80m de altura do piso para a manutenção do TRT realizar a montagem da estrutura e instalação dos equipamentos.
- * A posição dos pontos elétricos devem seguir o projeto.
- * Deverão ser puxados 2 circuitos independentes interligados no quadro principal do galpão e encaminhados para cada quadro novo (o da sala de reuniões e o da guarita).

ACRÉSCIMO FISCAL DURVAL:

Ponto elétrico d split d guarita. Junto com cobre
Dry ru
Parede sala conforme detalhado
Telha pintura eletrostática

Assinatura

Assinatura

2 / 2

				Relatório nº	17
				Data do relatório	11/03/2025
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	44 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	46 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Adeildo	Pedreiro	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Luis	Servente	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (6)		
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	25% - Em Andamento
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	25% - Em Andamento
5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 M	49% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.14 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	49.3 m²	100% - Concluída

Fotos (2)



2.14 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021



2.14 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	20
				Data do relatório	14/03/2025
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	47 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	43 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Adeildo	Pedreiro	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Luis	Servente	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de serralharia	Serralheiros	07:00 - 17:00	01:00	09:00	Terceiros

Atividades (7)		
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	25% - Em Andamento
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	25% - Em Andamento
5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 M	49% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.4 - AR CONDICIONADO 5.4.1 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	34.1 M	100% - Concluída
5.4 - AR CONDICIONADO 5.4.2 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	34.1 M	100% - Concluída

Comentários (1)	
Fiscalização TRT6 03/04/2025 16:02 A Contratante informa que a partir da presente data - 14 de março de 2025, integrará a equipe de fiscalização o Servidor José Flávio Azevedo, Engenheiro Civil lotado na SEFOO/CPLAN.	

Fotos (1)



5.4.1 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:21

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	22
				Data do relatório	18/03/2025
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	51 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	39 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Adeildo	Pedreiro	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Luis	Servente	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Equipe de serralharia	Serralheiros	07:00 - 17:00	01:00	09:00	Terceiros

Atividades (8)		
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	25 H	53% - Em Andamento
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4 H	50% - Em Andamento
5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 M	49% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	0 m²	94% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.3 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	0 m²	57% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	0 m²	Não iniciada

Comentários (1)	
Fiscalização TRT6 13/05/2025 08:31	Foi observado pela Fiscalização que a laje da guarita foi concretada.
Fotos (1)	



2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	23
				Data do relatório	19/03/2025
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	52 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	38 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Adeildo	Pedreiro	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Luis	Servente	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (8)		
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	53% - Em Andamento
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	50% - Em Andamento
5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 M	49% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.2 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	0 m²	94% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.3 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	0 m²	57% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	15 m²	29% - Em Andamento

Comentários (1)	
Fiscalização TRT6	13/05/2025 08:34 Foi observado pela Fiscalização que foi iniciado o serviço de assentamento do porcelanato.

Fotos (1)



2.13 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	29
				Data do relatório	01/04/2025
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	46/2024
Obra	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 27/01/2025 até 26/04/2025			Prazo contratual	90 dias
Local	Galpão de Transportes - Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE			Prazo decorrido	65 dias
Contratante	TRT6	Responsável	Engª Micheline Gomes	Prazo a vencer	25 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	09:00 - 17:00	07:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Wilkson	Engenheiro	07:00 - 10:00		03:00	Mão de Obra Direta
Adeildo	Pedreiro	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Luis	Servente	07:00 - 17:00	01:00	09:00	
Revenilson Silva	Encarregado de elétrica	07:00 - 17:00	01:00	09:00	

Atividades (9)		
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.1 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	64% - Em Andamento
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0 H	62% - Em Andamento
5.3 - LÓGICA 5.3.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0 M	49% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
5.2 - ELÉTRICA 5.2.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 proporcional à infra	0 UN	50% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	0 M	81% - Em Andamento
2 - SALA DE REUNIÃO E GUARITA 2.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO EUCATEX, MODELO N4 (PAINEL/VIDRO/VIDRO) COM PERFIL DE AÇO	5.1 m²	100% - Concluída
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 - RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	7.8 m²	100% - Concluída
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.2 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1.68 m²	100% - Concluída

Comentários (1)	
Fiscalização TRT6 13/05/2025 09:08 A Fiscalização observou que foi assentado o piso da guarita e instaladas as divisórias Eucatex.	

Fotos (2)



2.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO EUCATEX, MODELO N4 (PAINEL/VIDRO/VIDRO) COM PERFIL DE AÇO



1.1 - RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL

Assinatura

Assinatura
